

2024 ОНЫ 10 ДУГААР САР

МОНГОЛ УЛСЫН 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

ОРШИЛ

Монгол Улсын 2025 оны Төсвийн тухай хуулийг Засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Монгол Улсын төсөв их хэмжээний алдагдалтай байгаа энэ үед төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал хурцаар тавигдаж байна. Сүүлийн жилүүдэд төсвийн хөрөнгө оруулалтын өмнөх оноос шилжин ирж буй төслүүдийн төсөвт өртөг ихээхэн нэмэгдэх хандлагатай байсан.

Энэхүү товч судалгаагаар “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж (2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дугаар хавсралт)-ийн жагсаалтад багтсан шилжих төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийн өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийж, анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг гаргаж ирэхийг зорилгоо.


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралт болох “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын төслийг авч үзэхэд 33 төсвийн ерөнхийлөн захирагч (ТЭЗ)-ийн нийт 639 төсөл, арга хэмжээ тусгагдсан байна.


Үүний 108 буюу 16.9 хувь нь шинэ төсөл, арга хэмжээ бол 531 буюу 83.1 хувь нь шилжих арга хэмжээ байна. Төрлийн хувьд барилга байгууламж 555, тоног төхөөрөмж 53, их засвар 22, техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) 9 байна (Зураг 1).

Төсөл, арга хэмжээний төрлийг шинэ болон шилжих төслүүдээр авч үзвэл дараах байдалтай байна (Зураг 2).

Зураг 1. Монгол Улсын төсвөөс 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төрөл

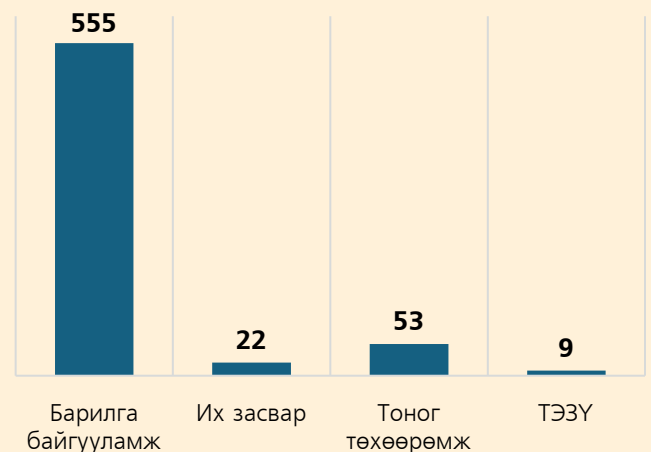

Зураг 2. Монгол Улсын төсвөөс 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шинэ болон шилжих төслүүдийн тоо (төрлөөр)

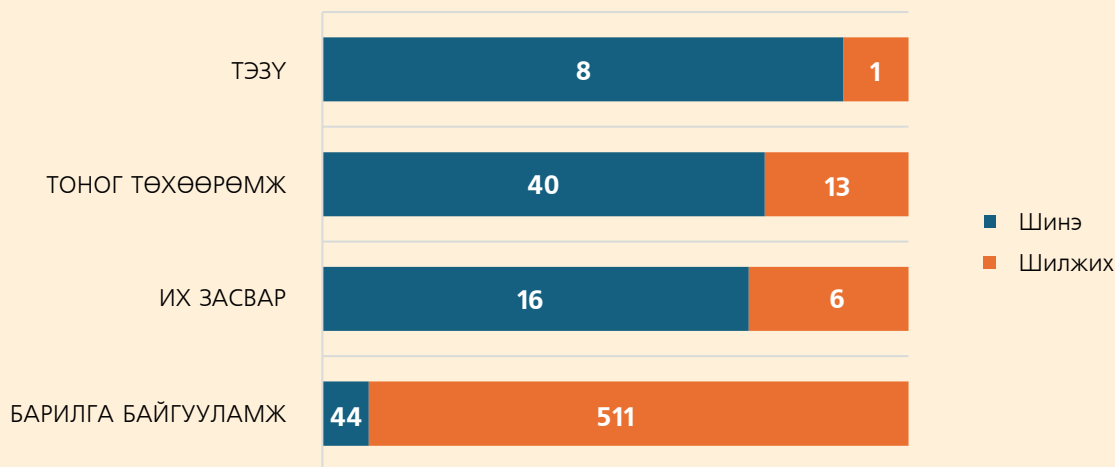

2025 онд шилжиж буй нийт төсөл, арга хэмжээний 96.2 хувийг барилга байгууламж, 2.4 хувийг тоног төхөөрөмж, 1.1 хувийг их засвар, 0.2 хувийг ТЭЗҮ тус тус эзэлжээ.

Өмнөх оноос шилжиж буй барилга байгууламжийн тоогоор Боловсролын сайд,

Зам, тээврийн сайд, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд тэргүүлж байна (Хүснэгт 1). Эдгээр гурван ТЕЗ-ийн шилжих барилга байгууламж нийт шилжиж буй барилга байгууламжийн 64 хувийг эзэлж байна.


Хүснэгт 1. Багцдаа хамгийн олон шилжих барилга байгууламж бүхий төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээний тоо (нийт шилжиж буй барилга байгууламжид эзлэх хувь)
Боловсролын сайд	190 (37.2%)
Зам, тээврийн сайд	87 (17.0%)
Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд	50 (9.8%)
Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд	46 (9.0%)
Эрүүл мэндийн сайд	31 (6.1%)

Өмнөх онуудаас 2025 онд шилжиж буй 531 төсөл, арга хэмжээний эхэлсэн оныг авч үзвэл 2018 ба түүнээс өмнө эхэлсэн 15 төсөл байна

(Зураг 3). 2024 онд эхэлсэн 366 төслийг 2025 онд санхүүжүүлэхээр байна.

Зураг 3. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн төсөлд туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тоо (эхэлсэн оноор)

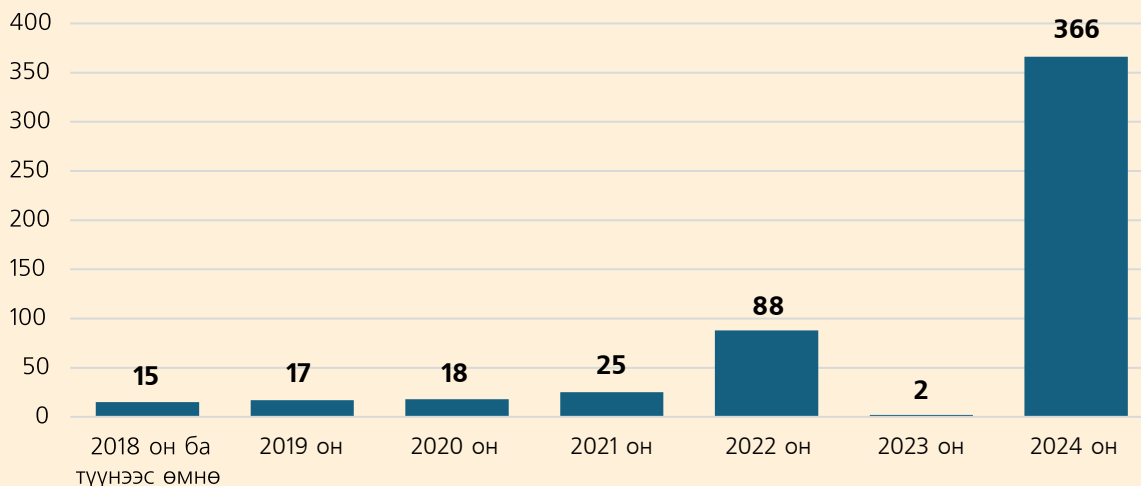

2025 онд санхүүжилт олгох хамгийн эрт эхэлсэн төсөл, арга хэмжээг авч үзвэл 2011 онд эхэлсэн 2 төсөл, 2012 онд эхэлсэн 1 төсөл, 2013 онд эхэлсэн 2 төсөл тус тус байна. Тэдгээрийг дурдвал:

2011 онд эхэлсэн төсөл, арга хэмжээ, ТЕЗ:

1. “Төв халх” дуулалт жүжгийн театр (Дундговь, Сайнцагаан сум)-Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд
2. Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл, сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд

2012 онд эхэлсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спорт танхимын барилга (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)-Эдийн засаг, хөгжлийн сайд

2013 онд эхэлсэн төсөл, арга хэмжээ

1. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд
2. Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг)-Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

Төсөл, арга хэмжээ эхэлсэн оны төсөвт өртөг ба 2025 оны төсөвт өртгийг 2018 он ба түүнээс хойш эхэлсэн төсөл, арга хэмжээний хувьд доор харьцуулж үзлээ (Хүснэгт 2).


Хүснэгт 2. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн төсөлд туссан 2018–2024 онд эхэлсэн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төсөвт өртгийн өөрчлөлт

Төсөвт өртгийн өөрчлөлтийн хувь	Төсөл, арга хэмжээний тоо, оноор						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Төсөвт өртөг буурсан	0	0	1	3	15	1	244
Төсөвт өртөг өөрчлөгдөөгүй	1	2	0	0	1	1	115
50 хүртэл хувиар өссөн	1	5	3	6	36	0	7
50 хувиас-2 дахин хүртэл дүнгээр өссөн	1	4	7	6	22	0	0
2 дахин ба түүнээс их дүнгээр өссөн	4	6	7	10	14	0	0
Нийт	7	17	18	25	88	2	366

2018 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Сургуулийн барилга, 250 суудал (Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 4 дахин өсөж, 1 тэрбум төгрөгөөс 4 тэрбум төгрөг болсон)
2. Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 2.7 дахин нэмэгдэж, 1.5 тэрбум төгрөгөөс 4.1 тэрбум төгрөг болсон)
3. Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор (Говь-Алтай, Халиун сум)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 2.2 дахин өсөж, 900 сая төгрөгөөс 2 тэрбум төгрөг болсон).

Зураг 4. 2018–2024 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн зарим төсөл, арга хэмжээ

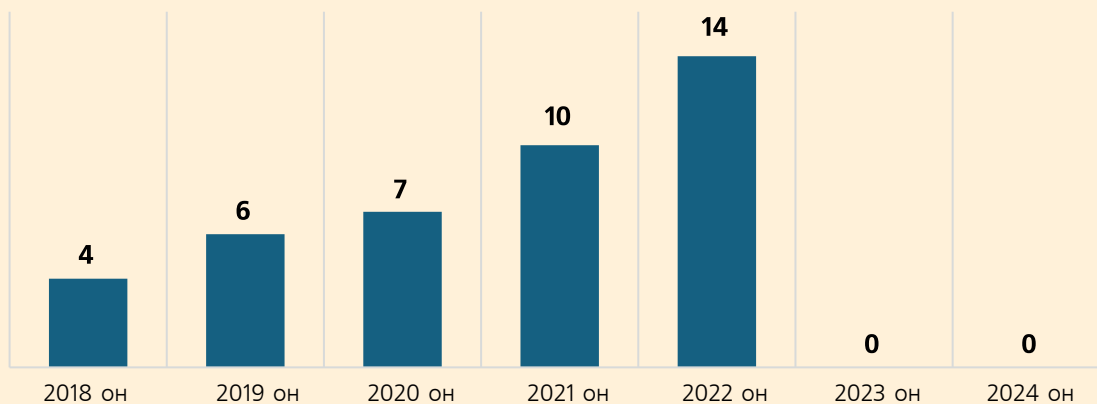

2019 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Спорт заалны барилга (Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон)-Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд (төсөвт өртөг 4.7 дахин өсөж, 250 сая төгрөгөөс 1.2 тэрбум төгрөг болсон)
2. Сургуулийн барилга, 960 суудал (Хөвсгөл, Тариалан сум)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 2.8 дахин нэмэгдэж, 4 тэрбум төгрөгөөс 11.2 тэрбум төгрөг болсон)
3. Сургуулийн барилга, 320 суудал (Баянхонгор, Баянцагаан сум)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 2.8 дахин өсөж, 3.4 тэрбум төгрөгөөс 9.5 тэрбум төгрөг болсон).

2020 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга (Говьсүмбэр)-Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд (төсөвт өртөг 3.6 дахин өсөж, 3.5 тэрбум төгрөгөөс 12.4 тэрбум төгрөг болсон)
2. Соёлын төвийн барилга, 200 суудал (Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум)-Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд (төсөвт өртөг 3.3 дахин нэмэгдэж, 1.4 тэрбум төгрөгөөс 4.6 тэрбум төгрөг болсон)
3. Сургуулийн барилга, 160 суудал (Баянхонгор, Заг сум)-Боловсролын сайд (төсөвт өртөг 2.9 дахин өсөж, 1.5 тэрбум төгрөгөөс 4.5 тэрбум төгрөг болсон).

2021 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Инженерийн шугам сүлжээ бүхий гэр хорооллын төсөл (Хөвсгөл, Мөрөн сум)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (төсөвт өртөг 7.3 дахин өсөж, 2.3 тэрбум төгрөгөөс 16.9 тэрбум төгрөг болсон)
2. Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга (Баян-Өлгий, Өлгий сум)-Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд (төсөвт өртөг 3.5 дахин нэмэгдэж, 1.9 тэрбум төгрөгөөс 6.8 тэрбум төгрөг болсон)
3. Музей, номын сангийн цогцолбор (Дархан-Уул, Дархан сум)-Соёл, спорт, аялал

жуулчлал, залуучуудын сайд (төсөвт өртөг 3.1 дахин өсөж, 5 тэрбум төгрөгөөс 15.6 тэрбум төгрөг болсон).

2022 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж (Ховд, Дарви сум)-Эрчим хүчний сайд (төсөвт өртөг 4.7 дахин өсөж, 5.5 тэрбум төгрөгөөс 25.7 тэрбум төгрөг болсон)
2. Орон сууцжуулах төслийн дэд бүтэц (Баянхонгор, Баацагаан сум)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (төсөвт өртөг 4.2 дахин нэмэгдэж, 2.3 тэрбум төгрөгөөс 9.7 тэрбум төгрөг болсон)
3. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт (Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Харзат баг)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (төсөвт өртөг 3.6 дахин өсөж, 1.2 тэрбум төгрөгөөс 4.3 тэрбум төгрөг болсон)
4. Гэр хорооллын цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил (Хөвсгөл, Мөрөн сум)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (төсөвт өртөг 3.2 дахин нэмэгдэж, 7 тэрбум төгрөгөөс 22.7 тэрбум төгрөг болсон)
5. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт (Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Индэрт баг)-Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд (төсөвт өртөг 3.2 дахин өсөж, 946 сая төгрөгөөс 3 тэрбум төгрөг болсон).

2023 онд эхэлсэн төслүүд

2023 он оноос шилжиж байгаа 2 төсөл, арга хэмжээний нэгийнх нь төсөвт өртөг буурчээ. Тухайлбал, Төв аймагт байршилтай "Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц" барилга байгууламжийн төсөвт өртөг 2023 онд батлагдахдаа 138.4 тэрбум төгрөг байсан бол 2025 онд төсөвт өртөг нь 2.3 тэрбум төгрөгөөр буурч, 135.6 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан байна. Харин Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй түгжрэлийг бууруулах,

хотын төвлөрлийг сааруулах асуудлын хүрээнд захиргааны зарим байгууллагын нэгдсэн цогцолбор барилгын дуусгах гэсэн 2023 онд эхэлсэн, 2026 онд дуусах хуваарьтай барилга байгууламжийн төслийн төсөвт өртөг 45 тэрбум төгрөг хэвээр байсан.

2024 онд эхэлсэн төслүүд

2024 онд эхэлсэн 366 төсөл, арга хэмжээний хувьд төсөвт өртөг нь багассан 244 төсөл, арга хэмжээ байгаа бол төсөвт өртөг нь өөрчлөгдөөгүй 115, 50 хүртэл хувиар өссөн ердөө 7 төсөл, арга хэмжээ байна.


2024 онд эхэлсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь хамгийн их нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ:

1. Хөдөөгийн алслагдсан багуудын харилцаа холбооны дэд бүтэц (Улсын хэмжээнд)-Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны сайд (төсөвт өртөг нь 1.2 дахин өсөж, 20 тэрбум төгрөгөөс 24.4 тэрбум төгрөг болсон)
2. Зэвсэгт хүчний тоног төхөөрөмж (Улсын хэмжээнд)-Батлан хамгаалахын сайд (төсөвт өртөг нь 40.6 тэрбум төгрөгөөс 45.4 тэрбум болж, 1.1 дахин нэмэгдсэн).

2025 онд шилжиж байгаа 531 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг 2024 онд батлагдаж байсан төсөвт өртөгтэй нь харьцуулахад тун сонирхолтой үр дүн гарсан. Тодруулбал, 2024 онд дээрх 531 төсөл, арга хэмжээний батлагдсан төсөвт өртөг нийт 7.5 их наяд төгрөг

байсан бол 2025 онд батлагдсан нийт төсөвт өртөг нь 7.4 их наяд төгрөг болж багассан байна. Төсөвт өртөг нь нэмэгдсэн 36 төсөл, арга хэмжээ байгаа бол буурсан 279 (270 нь барилга байгууламж, 8 нь тоног төхөөрөмж, 1 нь ТЭЗҮ), өөрчлөгдөөгүй 216 төсөл, арга хэмжээ байна. Төсөвт өртөг ийнхүү буурсан шалтгаан нь 2024 онд эхэлсэн олон төсөл, арга хэмжээний тендер зарлагдан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, санал болгосон дүнгээр нь гэрээ байгуулсантай холбоотой юм. Тухайлбал, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Ахмадын өргөөний барилгын төсөвт өртөг 2024 онд 2.66 тэрбум байсан бөгөөд “Мөнхийн үргэлжлэл” ХХК 2024 оны 4 дүгээр сард 2.59 тэрбум төгрөгөөр тендерт ялалт байгуулж, гэрээ байгуулах эрхтэй болсон байна.¹ Тиймээс 2025 оны төсвийн төсөлд уг барилгын төсөвт өртгийг 2.59 тэрбум гэж тусгасан байх жишээтэй. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилга,² Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн барилга,³ Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн ажил,⁴ Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 31 дүгээр хорооллын дулаан хангамжийн ажил⁵ зэргийг мөн авч үзэхэд шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан дүн нь 2024 оны төсөвт өртгөөс бага байсан тул 2025 оны төсвийн төсөлд төсөвт өртгийг нь гэрээний дүнгээр буюу багасгаж тусгасан байна.

Зураг 5. 2025 онд шилжсэн төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг 2024 онд батлагдсан төсөвт өртөгтэй харьцуулсан харьцуулалт

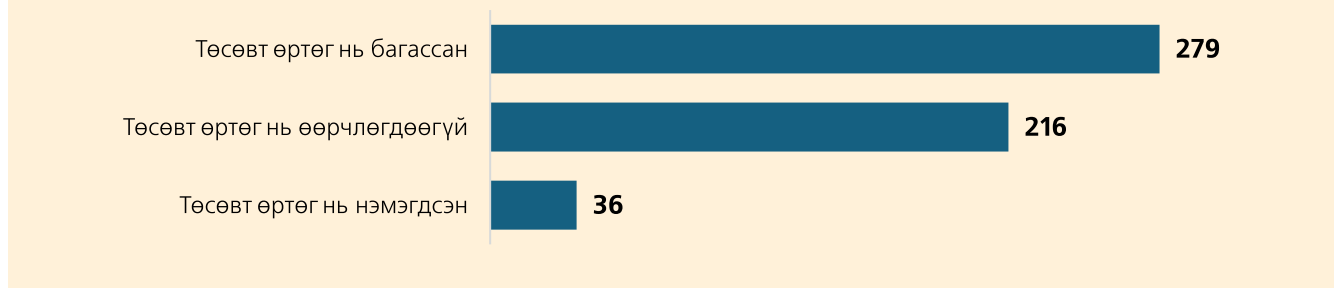

¹ <https://www.tender.gov.mn/mn/result/detail/1710902986664>
² <https://www.tender.gov.mn/mn/result/detail/1715157293351>
³ <https://www.tender.gov.mn/mn/result/detail/1718598385128>
⁴ <https://user.tender.gov.mn/mn/result/detail/1713407129788>
⁵ <https://www.tender.gov.mn/mn/result/detail/1713407334428>

Хүснэгт 3. 2024 онд батлагдсан төсөвт өртөгтэй харьцуулахад 2025 онд төсөвт өртөг нь мэдэгдэхүйц буурсан төсөл, арга хэмжээ

Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төрөл	Эхлэх/дуусах он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2025 оны төсөвт өртөг	2025/2024 оны өөрчлөлт
Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт (Улсын хэмжээнд)	Тоног төхөөрөмж	2019/2025	32.2 тэрбум	114.1 тэрбум	84.1 тэрбум	30 тэрбум төгрөгөөр буурсан
Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах (Баянхонгор)	Барилга байгууламж	2021/2025	12 тэрбум	15.3 тэрбум	9.7 тэрбум	5.6 тэрбум төгрөгөөр багассан
Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км (Хэнтий, Хэрлэн сум)	Барилга байгууламж	2024/2026	54.5 тэрбум	54.5 тэрбум	49.9 тэрбум	4.6 тэрбум төгрөгөөр багассан
Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл (Улсын хэмжээнд)	Барилга байгууламж	2022/2025	45.9 тэрбум	61.8 тэрбум	57.9 тэрбум	3.9 тэрбум төгрөгөөр багассан
Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км (Баян-Өлгий)	Барилга байгууламж	2024/2026	46.9 тэрбум	46.9 тэрбум	43.1 тэрбум	3.8 тэрбум төгрөгөөр багассан
Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд баригдах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц (Улсын хэмжээнд)	Барилга байгууламж	2022/2025	100.0 тэрбум	109.9 тэрбум	106.9 тэрбум	3.0 тэрбум төгрөгөөр багассан
Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км (Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум)	Барилга байгууламж	2022/2026	115.9 тэрбум	185.4 тэрбум	182.6 тэрбум	2.8 тэрбум төгрөгөөр буурсан
“Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц” төсөл (Төв)	Барилга байгууламж	2023/2026	138.4 тэрбум	138.4 тэрбум	135.6 тэрбум	2.8 тэрбум төгрөгөөр буурсан
Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ (Хэнтий, Хэрлэн сум, 3, 4, 5 дугаар баг)	Барилга байгууламж	2024/2026	62.8 тэрбум	62.8 тэрбум	60.3 тэрбум	2.5 тэрбум төгрөгөөр багассан
Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал (Төв, Зуунмод сум, 5 дугаар сургууль)	Барилга байгууламж	2024/2026	9.5 тэрбум	9.5 тэрбум	7.2 тэрбум	2.3 тэрбум төгрөгөөр буурсан

Хүснэгт 4. 2024 онд батлагдсан төсөвт өртөгтэй нь харьцуулахад 2025 онд төсөвт өртөг нь мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээ

Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төрөл	Эхлэх/дуусах он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2025 оны төсөвт өртөг	2025/2024 оны өөрчлөлт
Зэвсэгт хүчний тоног төхөөрөмж (Улсын хэмжээнд)	Тоног төхөөрөмж	2024/2025	40.6 тэрбум	40.6 тэрбум	45.4 тэрбум	4.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн
Хөдөөгийн алслагдсан багуудын харилцаа холбооны дэд бүтэц (Улсын хэмжээнд)	Барилга байгууламж	2024/2025	20 тэрбум	20 тэрбум	24.4 тэрбум	4.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг үзэхэд ижил хүчин чадалтай төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг анхаарал татахаар хэлбэлзэлтэй байсангүй. Тухайлбал, иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн байр Архангай аймгийн Булган сум, Цахир сум, Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сум, Тайшир сум гэсэн дөрвөн байршилд бүгд ойролцоо, 2.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй байв. Завхан аймгийн Улиастай сумын цагдаагийн газрын барилга 5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй

байгаа бол Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд 4.5 тэрбум төгрөг байсан. 100 ортой дотуур байрны барилгын төсөвт өртөг Архангай аймгийн Төвшрүүлэх суманд 2.8 тэрбум төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур суманд 3 тэрбум, Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр суманд 2.7 тэрбум төгрөг байгаа юм. Эдгээр төсөл, арга хэмжээнүүдийн ихэнх нь 2024 онд батлагдсан төсөл, арга хэмжээ байгаа бөгөөд төсөвт өртөг нь 2025 онд 2024 онд батлагдаж байсан төсөвт өртгөөсөө нэмэгдээгүй, харин ч багассан байна.

ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ СУДАЛГАА

Олон жил үргэлжилсэн бөгөөд төсөвт өртөг нь өөрчлөгдсөн зарим төслийн хэрэгжилт удааширсан шалтгааны талаар судалж үзлээ. Төслийн хэрэгжилт удаашрахад нөлөөлж буй хэд хэдэн шалтгаан байгаагийн дотор голчлон

тухайн онд санхүүжилт батлагддаггүй болон батлагдсан санхүүжилтийг цаг тухайд нь олгоогүйгээс үүдэлтэй байна. Энэ нь доорх төслүүдийн хэрэгжилтээс харагдаж байна. Үүнд:

Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд байршилтай “Төв халх” дуулалт жүжгийн театрын барилга

2012 онд Дундговь аймагт баригдаж эхэлсэн “Төв Халх” дуулалт жүжгийн театрын барилга нь эхний 2 жилийг эс тооцвол 2013-2018 онд улсын төсөвт тусгагдаагүйн улмаас санхүүжилтгүй болж, олон жил “царцсан” тул барилгын ажлын эхэн үед хийгдсэн барилгын суурь, шалны бетон арматур зэрэг нь элэгдэж, улмаар дахин хийх шаардлагатай болжээ. Энэ нь олон

жил үргэлжилж байгаа төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдэх шалтгаануудын нэг мөн бөгөөд төсвийн хөрөнгийг үрэлгэн, үр дүн муутай зарцуулж байгаагийн нэг тод жишээ юм. Төсөвт өртөг нь 2021 онд 4 тэрбум орчим төгрөгөөр нэмэгдсэн уг театрын барилга ажлыг 2025 онд дуусгахаар энэ оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгажээ.

Хүснэгт 5. Дундговь аймгийн "Төв Халх" дуулалт жүжгийн театрын барилгын төслийн санхүүжилт, хэрэгжилт

Төсвийн жил	Төсөвт өртөг, сая. төгрөг	Санхүүжих дүн, сая төгрөг	Эхлэх/дуусах он
2011	6,800.0	440.0	2011/2013
2012	6,800.0	3,300.0	2011/2014
2013	-	Тусгагдаагүй	-
2014	-	Тусгагдаагүй	-
2015	-	Тусгагдаагүй	-
2016	-	Тусгагдаагүй	-
2017	-	Тусгагдаагүй	-
2018	-	Тусгагдаагүй	-
2019	6,800.0	2,000.0	2011/2020
2020	6,800.0	50.0	2011/2021
2021	10,543.7	1,710.0	2011/2022
2022	10,543.7	200.0	2011/2023
2023	10,543.7	671.7	2011/2024
2024	10,543.7	2,000.0	2011/2025
2025	10,543.7	5,832.0	2011/2025

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2011-2025 оны төсвийн тухай хууль

Энэ төслийн эхний санхүүжилтэд төсөвт өртгийн ердөө 6.5 хувьтай тэнцэх л хөрөнгийг тусгаж байжээ. Төслийн санхүүжилт 2013-2018 оны төсөвт тусгагдаагүй бөгөөд 2019 оноос эхлэн санхүүжилт нь төсөвт дахин батлагдаж

эхэлсэн. Өнгөрсөн хугацааны батлагдсан санхүүжих дүн нийтдээ 16,203.7 сая төгрөг буюу 2025 оны төсөвт өртгөөс даруй 5,660 сая төгрөгөөр давж гараад байна.

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын "Говийн ирээдүй цогцолбор" сургуулийн барилга

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургуулийн 960 суудалтай шинэ барилгын суурь тавих үйл ажиллагаа 2021 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр болсон. Сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж, суурин дээр нь шинэ барилгын шав тавьсан бөгөөд

"Си Эйч Ди Жи" ХХК 2021-2022 онд хийж дуусгахаар төлөвлөсөн. Гэвч 2024 оны 9 дүгээр сар гэхэд барилгын ажил дуусаагүй, сурагчид сургуулийнхаа өөр нэг хуучин байранд хичээллэж байна.

Хүснэгт 6. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын "Говийн ирээдүй" цогцолбор сургуулийн барилгын төслийн санхүүжилт, хэрэгжилт

Төсвийн жил	Төсөвт өртөг, сая. төгрөг	Санхүүжих дүн, сая төгрөг	Эхлэх/дуусах он
2021	5,496.4	2,748.2	2021/2022
2022	5,496.4	2,748.2	2021/2022
2023	5,987.9	491.5	2021/2023
2024	14,726.6	4,454.3	2021/2025
2025	14,274.3	4,369.4	2021/2025

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2021-2025 оны төсвийн тухай хууль

Энэ төслийн эхний 2 жилд санхүүжилтэд төсөвт өртгийн тус бүр 50 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг тусгаж 2022 онд багтаан дуусгахаар төсөвлөж төсвийн тухай хуулийг баталсан ч бодит байдал дээр гүйцэтгэгч компанид санхүүжилт олгогдоогүй. Цалин хөлс, барилгын түүхий

эдийн зардлын өсөлтөөс шалтгаалан 2024 онд тус барилгын төсөвт өртөг анхны төсөвт өртгөөс даруй 2.7 дахин нэмэгджээ. 2024 оны 8 сарын байдлаар барилгын ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байсан.

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилгыг 2021 оноос орон нутгийн "Монстрой-Эра" ХХК барьж эхэлсэн. Тус хөгжлийн төв нь 3000 м²

талбайтай, дотроо хүүхэд, залуучуудад зориулсан төрөл бүрийн сургалтын танхим, усан бассейн, урлаг, спортын заал, номын сан, кофе шоп, тоглоомын талбайтай байх аж.

Хүснэгт 7. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилгын төслийн санхүүжилт, хэрэгжилт

Төсвийн жил	Төсөвт өртөг, сая. төгрөг	Санхүүжих дүн, сая төгрөг	Эхлэх/дуусах он
2021	1,930.0	422.4	2021/2022
2022	1,930.0	1,507.0	2021/2022
2023	6,803.9	500.0	2021/2024
2024	6,803.9	4,393.6	2021/2024
2025	6,803.9	1,000.1	2021/2025

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2021-2025 оны төсвийн тухай хууль

Энэ төслийн эхний санхүүжилтэд төсөвт өртгийн 21.9 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг тусгаж байжээ. Барилгын төсөвт өртөг 2023 онд 3.5 дахин нэмэгдсэн бөгөөд энэ нь тухайн төсөл,

арга хэмжээг төлөвлөсөн хугацаанд дуусгаж чадахгүй байх нь ямар хор уршигтай вэ гэдгийг харуулж байгаа өөр нэг жишээ юм.

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын музей, номын сангийн цогцолбор

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын "Миний Монгол" цэцэрлэгт хүрээлэнд Музей, номын сангийн цогцолборын барилга 2021 оноос

баригдаж эхэлсэн. Тус барилга нь зоорины давхартайгаа нийлээд дөрвөн давхар, нийт 5900 м.кв талбай бүхий цогцолбор юм.

Хүснэгт 8. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Музей, номын сангийн цогцолборын барилгын төслийн санхүүжилт, хэрэгжилт

Төсвийн жил	Төсөвт өртөг, сая. төгрөг	Санхүүжих дүн, сая төгрөг	Эхлэх/дуусах он
2021	5,000.0	1,000.0	2021/2022
2022	14,533.0	2,400.0	2021/2023
2023	15,600.5	5,920.0	2021/2024
2024	15,600.5	6,280.5	2021/2024
2025	15,600.5	1,143.0	2021/2025

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2021-2025 оны төсвийн тухай хууль

Энэ төслийн эхний санхүүжилтэд төсөвт өртгийн 20 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг тусгаж байжээ. 4 давхар барилгын ажилд төсөвт өртгийн 20 хувийн санхүүжилтийг олгохоор баталсан хэр дараа жил нь ашиглалтад оруулна гэж төлөвлөх нь анхнаасаа бодитой биш байсныг өнөө хэр дуусаагүй барилга харуулж байна. Түүнчлэн төсөвт өртгийг эхнээсээ хэт багаар тооцжээ. Гүйцэтгэгч компани ажлаа 2021 оны 8 сарын 27-нд буюу тухайн ондоо нэлээд орой эхлүүлсэн бөгөөд зураг төслөөс суурийн өндрийн түвшин зөрсөн учраас алдааг засварлуулах шаардлага гарсан. Энэ нь мөн барилгын ажлын гүйцэтгэл

удаашрахад нөлөөлжээ (Эх сурвалж: <https://oronzai.mn/n/fvL3KvxApCJ96xJ9hBSg>).

2022 онд барилгын төсөвт өртөг 14.5 тэрбум төгрөг болж нэмэгдэхэд дахин тендер зарласан ч зөвхөн нэг л оролцогч буюу эхний гүйцэтгэгч компани болох “Вокон Констракшн” ХХК санал ирүүлсэн ч шаардлага хангаагүй тул тендер амжилтгүй болсон. 2023 онд цогцолборын интерьерийн зураг төслийн тендер шалгаруулалт зарлагдахад “Эрхэс Констракшн” ХХК шалгарсан байна. “Вокон Констракшн” ХХК 2023 оноос барилгын ажлыг дахин үргэлжлүүлжээ.

ДҮГНЭЛТ

1. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд дурдсанаар 531 төсөл, арга хэмжээ өмнөх онуудаас шилжиж байгаа бөгөөд энэ нь нийт төсөл, арга хэмжээний 83.1 хувийг эзэлж байна.
2. 2025 онд шилжиж буй нийт төсөл, арга хэмжээний 96.2 хувийг барилга байгууламж эзэлж байна.
3. Хамгийн олон шилжих барилга байгууламж Боловсролын сайд, Зам тээрийн сайд, Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайдын багцад байна.
4. Төсөвт өртөг нь 2 ба түүнээс их дахин нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээний тоо жилээс жилд өсөх хандлагатай байна. Тодруулбал, 2018 оны төсөвт 4, 2019 онд 6, 2020 онд 18, 2021 онд 25, 2022 онд 14 төсөл, арга хэмжээ тус тус байсан.
5. 2025 оны төсвийн төсөлд шилжих төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нэлээд бууруулан тусгасан байна. Тухайлбал, 2022 оноос шилжиж байгаа 15 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг 2025 оны төсвийн төсөлд бууруулан төсөвлөсөн бол 2024 оноос шилжиж байгаа 244 төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг мөн багасган тусгажээ.
6. 2025 оны төсвийн төсөлд 2011 оноос 2 төсөл, арга хэмжээ шилжиж байгаа нь хамгийн эрт батлагдсан төсөл, арга хэмжээ болж байна.
7. Төслийн хэрэгжилт удаашрахад нөлөөлж буй хэд хэдэн шалтгаан байгаагийн дотор голчлон тухайн онд санхүүжилт батлагддаггүй болон батлагдсан санхүүжилтийг цаг тухайд нь олгоогүйгээс үүдэлтэй байна.
8. 2025 онд шилжих 531 төсөл, арга хэмжээний 287 (54 хувь) нь 2025 онд, 238 (44.8 хувь) нь 2026 онд, 6 (1.1 хувь) нь 2027 онд дуусах хуваарьтай байна.
9. 2025 оны төсвийн төсөлд тусгагдсан шилжих төсөл, арга хэмжээнүүдийн төсөвт өртөг төдийлөн нэмэгдээгүй, эхэлсэн оныг өөрчилсөн зөрчилгүй байна. Үүнийг цаашид сайн жишиг болгох хэрэгтэй.
10. Тухайн оны төсвийн тухай хуулийн Хавсралт 2 буюу улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, байгууламжийн жагсаалтад төсөл тус бүрийн тухайн он хүртэл хугацаанд авсан санхүүжилтийн нийт дүн буюу гүйцэтгэлийн дүнг нэмж тусгадаг болох.

ХАВСРАЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУССАН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЬ
НЭМЭГДСЭН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

(сая төгрөг)

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг		Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн		
	IV	МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД							
	IV.2	Шинжлэх ухаан							
	IV.2.1	I. Барилга байгууламж							
1	IV.2.1.1	Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор /УБ/	УТ2001500725	2020	2026	94,000.0	154,491.7	64.4%	30,444.7
2	IV.2.1.2	Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спорт танхимын барилга / УБ, БЗД, 13 дугаар хороо/	УТ2101501043	2012	2025	4,000.0	5,278.8	32.0%	1,000.2
	V	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД							
	V.1	Онцгой байдлын ерөнхий газар							
	V.1.1	I. Барилга байгууламж							
3	V.1.1.2	Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжлийн сургалтын төвийн барилга /УБ/	УТ2100900057	2022	2025	4,400.0	12,461.2	163.2%	5,118.5
	V.2	Алтанбулаг чөлөөт бүс							
	V.2.1	I. Барилга байгууламж							
	VI	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА							
	VI.1	I. Барилга байгууламж							
4	VI.1.16	Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга /УБ, ХУД/	УТ2001000070	2021	2025	18,827.2	20,723.0	10.1%	4,002.0
	X	САНГИЙН САЙД							
	X.1	Гаалийн ерөнхий газар							
	X.1.3	III. Тоног төхөөрөмж							
5	X.1.3.3	Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт /Улсын хэмжээнд/	УТ2001100127	2019	2025	32,195.2	114,143.9	161.1%	16,400.0

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
	XI	ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД								
	XI.1	Хил хамгаалах ерөнхий газар								
	XI.1.3	III. Тоног төхөөрөмж								
6	XI.1.3.3	Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженерийн байгууламжийн шинэчлэлт /Улсын хэмжээнд/	УТ2101201136	2021	2025	17,325.4	18,325.4	18,325.4	5.8%	4,274.4
	XII	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД								
	XII.2	Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб								
	XII.2.3	III. Тоног төхөөрөмж								
7	XII.2.3.1	Зэвсэгт хүчний тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/	УТ2401400221	2024	2025	40,576.3	40,576.3	45,358.7	11.8%	9,593.4
	XIV	БОЛОВСРОЛЫН САЙД								
	XIV.1	Боловсрол								
	XIV.1.1	I. Барилга байгууламж								
8	XIV.1.1.1 0	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /УБ, БНД, 3 дугаар хороо/	УТ2101500839	2022	2025	3,500.0	6,824.4	6,730.8	92.3%	3,230.8
9	XIV.1.1.1 1	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /УБ, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	УТ2101500875	2022	2025	4,552.7	5,039.6	5,039.7	10.7%	684.6
10	XIV.1.1.1 2	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /УБ, ХУД, 8 дугаар хороо/	УТ2101500873	2022	2025	4,552.7	5,838.0	5,798.3	27.4%	5,698.3
11	XIV.1.1.1 3	Дотуур байрны барилга буулгаж, шинээр барих, 160 ор /Говь-Алтай, Баян-Уул сум, 1 дүгээр баг/	УТ2101500208	2022	2025	3,515.0	5,694.4	5,694.4	62.0%	2,465.9
12	XIV.1.1.1 4	Дотуур байрны барилга, 120 ор /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	УТ2101500524	2022	2025	2,274.2	4,559.1	4,559.1	100.5%	2,185.8
13	XIV.1.1.1 5	Дотуур байрны барилга, 160 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/	УТ2101500351	2022	2025	2,916.2	4,795.3	4,795.3	64.4%	1,903.0
14	XIV.1.1.1 6	Дотуур байрны барилга, 160 ор /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/	УТ2101501264	2022	2025	3,229.9	5,173.5	5,173.5	60.2%	1,946.1
15	XIV.1.1.1 8	Насан туршийн боловсролын төвийн барилга /УБ, БЗД, 21, 27-р хороо/	УТ2101500127	2022	2025	2,500.0	3,184.3	3,184.3	27.4%	886.3

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
16	XIV.1.1.11.9	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 960 суудал /УБ, БГД, 11 дүгээр хороо, 28 дугаар сургууль/	УТ2101500824	2022	2025	11,000.0	15,701.8	15,701.8	42.7%	5,002.6
17	XIV.1.1.12.0	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, спорт заал, 960 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, 3 дугаар сургууль/	УТ2101500445	2022	2025	8,233.1	16,489.3	15,992.4	94.2%	8,586.1
18	XIV.1.1.12.1	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/	УТ2101501208	2022	2025	4,900.0	5,977.0	5,977.1	22.0%	1,000.1
19	XIV.1.1.12.2	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	УТ2101500073	2022	2025	7,411.7	12,367.0	12,367.0	66.9%	6,965.4
20	XIV.1.1.12.3	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум, 5 дугаар баг/	УТ2101500397	2022	2025	8,157.0	11,529.8	11,529.4	41.3%	2,006.4
21	XIV.1.1.12.4	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /УБ, БЗД, 26 дугаар хороо, Олимп хотхон/	УТ2101500822	2022	2025	10,200.0	17,929.8	17,927.2	75.8%	2,863.6
22	XIV.1.1.12.5	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Галт сум, 5 дугаар баг/	УТ2101501256	2022	2025	10,123.0	14,447.9	14,447.9	42.7%	2,000.0
23	XIV.1.1.12.6	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Хөвсгөл, Жаргалант сум, 5 дугаар баг/	УТ2101501257	2022	2025	10,123.0	15,105.5	15,105.5	49.2%	2,000.1
24	XIV.1.1.12.7	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр сургууль/	УТ2101500681	2022	2025	11,000.0	15,469.4	15,469.4	40.6%	4,347.2
25	XIV.1.1.12.9	Сургуулийн барилга, урлаг заал /Дорнод, Баяндун сум, 1 дүгээр баг/	УТ2101500357	2022	2025	3,373.4	4,577.9	4,577.9	35.7%	1,285.5
26	XIV.1.1.13.0	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /УБ, СБД, 2 дугаар хороо, 31 дүгээр сургууль/	УТ2101500917	2022	2025	2,600.0	5,239.3	5,239.3	101.5%	2,711.8
27	XIV.1.1.13.1	Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Отгон сум/	УТ2101500409	2022	2025	1,693.0	2,207.3	2,207.3	30.4%	417.2
28	XIV.1.1.13.2	Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	УТ2101500413	2022	2025	1,232.1	2,119.0	2,119.0	72.0%	790.4
29	XIV.1.1.13.3	Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, 160 суудал /Говь-Алтай, Дэлгэр сум, Гуулин тосгон/	УТ2101500242	2022	2025	2,853.0	3,119.1	3,119.1	9.3%	535.8

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
30	XIV.1.1.13 5	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /УБ, БЗД, 5 дугаар хороо, 52 дугаар цэцэрлэг/	УТ2101500920	2022	2025	3,600.0	5,285.4	5,285.4	46.8%	1,808.0
31	XIV.1.1.13 6	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /УБ, ЧД, 6 дугаар хороо, 108 дугаар цэцэрлэг/	УТ2101500921	2022	2025	2,910.0	6,956.2	6,600.0	126.8%	5,800.0
32	XIV.1.1.13 7	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /УБ, ЧД, 6 дугаар хороо, 74 дүгээр цэцэрлэг/	УТ2101500922	2022	2025	2,860.0	6,710.3	6,710.4	134.6%	5,910.4
33	XIV.1.1.13 9	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	УТ2101500092	2022	2025	2,882.7	3,529.5	3,529.5	22.4%	704.8
34	XIV.1.1.14 0	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь сум, 1 дүгээр баг/	УТ2101500264	2022	2025	2,200.0	2,769.3	2,769.4	25.9%	633.6
35	XIV.1.1.14 1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дундговь, Эрдэнэдалай сум, 2 дугаар цэцэрлэг/	УТ2201511865	2022	2025	2,094.0	3,346.7	3,336.6	59.3%	2,275.1
36	XIV.1.1.14 2	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 4 дүгээр баг/	УТ2101500595	2022	2025	4,154.0	6,399.4	6,399.5	54.1%	1,400.1
37	XIV.1.1.14 3	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /УБ, СХД, 40 дүгээр хороо/	УТ2101500884	2022	2025	3,000.0	5,695.3	5,695.3	89.8%	2,841.3
38	XIV.1.1.14 4	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /УБ, СХД, 42 дугаар хороо/	УТ2101500885	2022	2025	3,000.0	5,654.9	5,654.9	88.5%	2,885.1
39	XIV.1.1.14 5	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /УБ, БГД, 9 дүгээр хороо, Өргөө цэцэрлэг/	УТ2201511868	2022	2025	2,000.0	2,361.0	2,361.0	18.1%	561.4
40	XIV.1.1.14 6	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /УБ, СБД/	УТ2101500985	2022	2025	1,522.7	1,891.9	1,892.0	24.3%	371.0
41	XIV.1.1.14 7	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/	УТ2201511870	2022	2025	2,000.0	5,318.0	5,318.0	165.9%	3,268.8
42	XIV.1.1.14 8	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор /УБ, БГД, 198 дугаар цэцэрлэг/	УТ2101500992	2022	2025	4,452.6	4,984.8	4,984.9	12.0%	535.6
43	XIV.1.1.14 9	Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга /УБ, Налайх дүүрэг, 6 дугаар хороо/	УТ2301514888	2021	2025	3,300.0	4,887.2	4,887.1	48.1%	1,286.7
44	XIV.1.1.15 1	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/	УТ2001500630	2021	2025	1,700.0	3,908.6	3,908.5	129.9%	1,000.0
45	XIV.1.1.15 2	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Говь-Алтай, Тонхил сум/	УТ2001500591	2021	2025	2,800.0	5,599.3	5,599.3	100.0%	1,043.3
46	XIV.1.1.15 3	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Заамар сум, Хайлааст баг/	УТ2101500642	2021	2025	2,865.1	6,199.9	6,200.0	116.4%	1,840.1

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
47	XIV.1.1.15 4	Сургуулийн барилга, 960 суудал / Дундговь, Сайнцагаан сум, Говийн ирээдүй цогцолбор/	УТ2001500586	2021	2025	5,496.4	14,726.6	14,274.3	159.7%	4,369.4
48	XIV.1.1.15 5	Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2001500639	2021	2025	8,800.0	13,834.3	13,834.4	57.2%	4,616.6
49	XIV.1.1.15 6	Сургуулийн барилга, урлаг заал, 200 суудал /Хэнтий, Мөрөн сум/	УТ2001500595	2021	2025	2,500.0	5,014.4	5,014.4	100.6%	1,617.1
50	XIV.1.1.15 7	Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал /Ув, СХД, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль/	УТ2001500613	2021	2025	7,300.0	21,387.3	21,387.4	193.0%	4,912.1
51	XIV.1.1.15 8	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	УТ2301514887	2021	2025	1,400.0	2,480.1	2,480.1	77.2%	698.6
52	XIV.1.1.15 9	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/	УТ2001500603	2021	2026	1,500.0	2,564.2	2,564.2	70.9%	1,158.8
53	XIV.1.1.16 0	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	УТ2001500597	2021	2025	2,200.0	5,581.1	5,581.1	153.7%	2,294.2
54	XIV.1.1.16 1	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Ув, СХД, 7 дугаар хороо/	УТ2001500377	2020	2025	3,500.0	6,659.2	6,659.2	90.3%	3,158.4
55	XIV.1.1.16 2	Спорт, урлагийн цогцолбор сургууль, 320 суудал /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	УТ2001500504	2020	2025	2,500.0	7,003.0	7,003.0	180.1%	1,730.8
56	XIV.1.1.16 3	Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баянхонгор, Заг сум/	УТ2001500514	2020	2025	1,540.0	4,516.0	4,495.2	191.9%	2,976.0
57	XIV.1.1.16 4	Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/	УТ2301514892	2020	2025	2,000.0	3,944.2	3,944.2	97.2%	1,354.6
58	XIV.1.1.16 5	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	УТ2001553561	2020	2025	4,000.0	9,371.9	9,351.2	133.8%	319.6
59	XIV.1.1.16 6	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Ув, БЗД, 13 дугаар хороо, 14 дүгээр сургууль/	УТ2101501433	2020	2025	3,800.0	9,881.0	9,881.0	160.0%	4,644.5
60	XIV.1.1.16 7	Сургуулийн спорт заалны барилга /Хэнтий, Биндэр сум/	УТ2101501414	2020	2025	500.0	1,245.7	1,245.7	149.1%	391.5
61	XIV.1.1.16 8	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Ув, БЗД, 27 дугаар хороо, 45 дугаар цэцэрлэг/	УТ2001500461	2020	2025	2,500.0	3,789.7	3,789.8	51.6%	1,199.8
62	XIV.1.1.16 9	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	УТ2001500524	2019	2025	3,432.9	9,534.6	9,534.6	177.7%	5,220.2

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
63	XIV.1.1.17 0	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	УТ2101500533	2019	2025	3,500.0	4,664.3	4,660.1	33.1%	504.5
64	XIV.1.1.17 1	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий, Өлгий сум, Кутты мекен хотхон/	УТ2001500537	2019	2025	5,000.0	10,597.7	10,597.7	112.0%	3,800.9
65	XIV.1.1.17 2	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан сум, 2 дугаар сургууль/	УТ2101500546	2019	2025	5,000.0	8,458.3	8,458.3	69.2%	2,000.0
66	XIV.1.1.17 3	Сургуулийн барилга, 720 суудал /УБ, СБД, 12 дугаар хороо/	УТ2001500549	2019	2025	6,040.0	9,681.5	9,678.8	60.2%	2,084.9
67	XIV.1.1.17 4	Сургуулийн барилга, 960 суудал /УБ, БЗД, 2 дугаар хороо/	УТ2001500554	2019	2025	6,500.0	8,668.3	8,668.3	33.4%	715.0
68	XIV.1.1.17 5	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Хөвсгөл, Тариалан сум/	УТ2001500556	2019	2025	4,000.0	11,182.6	11,182.6	179.6%	848.2
69	XIV.1.1.17 7	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 4 дүгээр сургууль/	УТ2001500389	2019	2025	3,100.0	7,113.0	7,113.1	129.5%	4,188.9
70	XIV.1.1.17 9	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /УБ, ЧД, 12 дугаар хороо/	УТ2001500399	2018	2025	2,000.0	4,217.8	4,217.9	110.9%	582.5
71	XIV.1.1.18 0	Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/	УТ2001550575	2018	2025	1,000.0	3,953.6	3,953.6	295.4%	1,357.2
72	XIV.1.1.18 1	Сургуулийн барилга, 640 суудал /УБ, СХД, 32 дугаар хороо/	УТ2101501033	2018	2025	4,396.8	5,051.3	5,004.7	13.8%	605.7
73	XIV.1.1.18 2	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /УБ, СБД, 71 дүгээр сургууль/	УТ2101500838	2018	2025	1,500.0	4,050.6	4,050.6	170.0%	793.4
74	XIV.1.1.18 3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /УБ, ЧД, 5 дугаар сургууль/	УТ2101500831	2018	2025	4,000.0	6,805.2	6,805.2	70.1%	1,101.0
75	XIV.1.1.18 4	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Халиун сум/	УТ2001551938	2018	2025	900.0	2,000.3	2,000.4	122.3%	834.1
76	XIV.1.1.18 6	Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн монголын талын хөрөнгө /УБ, БЗД/	УТ2101500883	2015	2025	12,900.0	23,012.6	23,012.6	78.4%	9,619.4
	XIV.1.2	II. Их засвар								

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
77	XIV.1.2.1	Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж /УБ, ЧД/	УТ2101501041	2022	2025	1,000.0	1,285.0	1,285.1	28.5%	249.5
	XV	ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД								
	XV.2	Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газар								
	XV.2.1	I. Барилга байгууламж								
78	XV.2.1.7	Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2003900019	2021	2025	1,930.0	6,803.9	6,803.9	252.5%	1,000.1
79	XV.2.1.8	Усан спорт цогцолбор /УБ, СХД, Найрамдал зуслан/	УТ2003900155	2014	2025	5,000.0	17,240.3	17,240.3	244.8%	850.1
	XV.4	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар								
	XV.4.1	I. Барилга байгууламж								
80	XV.4.1.5	Ахмадын сувиллын барилга /УБ, Налайх дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	УТ2103900905	2022	2025	2,599.9	6,795.2	6,795.1	161.4%	4,095.2
81	XV.4.1.6	Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга /УБ, БНД/	УТ2203900015	2022	2025	950.0	1,235.8	1,235.8	30.1%	238.3
82	XV.4.1.7	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга /УБ, ЧД/	УТ2103900765	2022	2025	13,375.0	14,096.4	14,096.4	5.4%	550.1
83	XV.4.1.8	Ахмадын сувиллын барилга /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	УТ2103900173	2021	2025	1,250.0	3,125.0	2,954.0	136.3%	829.1
	XVI	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД								
	XVI.1	Авто зам								
	XVI.1.1	I. Барилга байгууламж								
84	XVI.1.1.86	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	УТ2102800333	2022	2026	49,820.0	84,892.6	84,892.6	70.4%	29,000.0
85	XVI.1.1.87	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	УТ2102800331	2022	2027	114,044.9	187,003.4	185,514.9	62.7%	48,532.5
86	XVI.1.1.88	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-Уул сум/	УТ2102801338	2022	2025	66,740.0	75,380.7	75,050.2	12.5%	33,433.6
87	XVI.1.1.89	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	УТ2102800162	2022	2025	29,900.0	32,090.2	32,090.3	7.3%	2,420.1

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
88	XVI.1.1.90	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	УТ2102800632	2022	2026	115,862.7	185,396.8	182,566.3	57.6%	30,000.0
89	XVI.1.1.91	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	УТ2102800640	2022	2025	8,500.0	11,402.1	11,402.1	34.1%	4,097.0
90	XVI.1.1.94	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	УТ2102800470	2022	2025	51,600.0	67,941.3	67,898.6	31.6%	37,355.9
91	XVI.1.1.96	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	УТ2102801334	2022	2025	109,129.0	151,859.4	151,817.0	39.1%	57,719.8
92	XVI.1.1.97	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь- Алтай, Есөнбулаг сум/	УТ2002800035	2021	2025	3,200.0	3,607.5	3,607.6	12.7%	736.1
93	XVI.1.1.98	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	УТ2002800867	2019	2025	48,000.0	52,102.0	52,102.0	8.5%	19,901.6
94	XVI.1.1.99	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол- Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	УТ2002800829	2019	2025	69,000.0	71,070.5	71,070.5	3.0%	5,822.3
	XVI.3	Тээвэр								
	XVI.3.1	I. Барилга байгууламж								
95	XVI.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2102800085	2022	2026	2,515.3	4,592.9	4,592.9	82.6%	3,242.9
	XVII	СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН САЙД								
	XVII.1	Соёл								
	XVII.1.1	I. Барилга байгууламж								
96	XVII.1.1.23	Кино театрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/	УТ2103401202	2022	2025	2,453.8	5,432.9	5,432.9	121.4%	1,000.1
97	XVII.1.1.25	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Өвөрхангай, Хужирт сум/	УТ2103400484	2022	2025	2,500.0	3,950.3	3,950.4	58.0%	727.1

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
98	XVII.1.1.26	Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори /Төв, Зуунмод сум/	УТ2003400788	2021	2025	18,000.0	26,177.7	26,177.8	45.4%	10,000.1
99	XVII.1.1.27	Музей, номын сангийн цогцолбор / Дархан-Уул, Дархан сум/	УТ2003400784	2021	2025	5,000.0	15,600.5	15,600.5	212.0%	1,143.0
100	XVII.1.1.28	Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Сүхбаатар, Баяндэлгэр сум/	УТ2003400783	2021	2026	1,988.5	2,285.8	2,285.9	15.0%	1,328.4
101	XVII.1.1.29	Байгалийн түүхийн музейн барилга /УБ, ХУД/	УТ2003400774	2020	2026	94,460.1	130,618.4	130,618.4	38.3%	30,080.5
102	XVII.1.1.30	Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга /Говьсүмбэр/	УТ2003400769	2020	2025	3,500.0	12,430.3	12,430.3	255.2%	4,169.1
103	XVII.1.1.31	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/	УТ2003400749	2020	2025	1,400.0	4,600.0	4,600.0	228.6%	2,313.8
104	XVII.1.1.32	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Өлзийт сум/	УТ2003400739	2020	2025	1,300.0	2,284.2	2,284.2	75.7%	375.9
105	XVII.1.1.33	Соёлын төвийн барилга, 400 суудал /Хэнтий, Норовлин сум/	УТ201500761	2020	2025	4,000.0	5,137.1	5,137.2	28.4%	128.4
106	XVII.1.1.34	Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Дундговь, Цагаандэлгэр сум/	УТ2003400753	2019	2025	1,230.0	2,288.2	2,288.3	86.0%	960.0
107	XVII.1.1.35	"Төв халх" дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/	УТ2003400730	2011	2025	6,800.0	10,543.7	10,543.7	55.1%	5,832.0
	XVII.2	Спорт								
	XVII.2.1	I. Барилга байгууламж								
108	XVII.2.1.13	Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/	УТ2003100062	2021	2025	9,900.0	17,309.6	17,309.6	74.8%	4,351.7
109	XVII.2.1.14	Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/	УТ2103100221	2019	2025	250.0	1,187.0	1,187.0	374.8%	311.0
110	XVII.2.1.15	Усан бассейн спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	УТ2003100009	2019	2025	9,000.0	14,035.4	13,091.5	45.5%	1,047.1
	XVIII	ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН САЙД								
	XVIII.1	I. Барилга байгууламж								
111	XVIII.1.34	"Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1 дүгээр хэлхээний шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто зам /УБ, ХУД/	УТ2102900752	2022	2025	29,900.0	33,716.3	33,716.3	12.8%	8,881.8

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
112	XVIII.1.37	Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд баригдах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц /Улсын хэмжээнд/	УТ2102901139	2022	2025	100,000.0	109,856.3	106,826.5	6.8%	30,125.1
113	XVIII.1.38	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны шинэчлэл /УБ, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	УТ2202911667	2022	2025	5,000.0	8,400.0	8,131.9	62.6%	636.9
114	XVIII.1.39	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Индэрт баг/	УТ2102900220	2022	2025	946.2	3,031.6	3,031.7	220.4%	1,000.0
115	XVIII.1.40	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Харзат баг/	УТ2102900231	2022	2025	1,166.4	4,255.0	4,255.0	264.8%	1,813.6
116	XVIII.1.41	Гэр хорооллын цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	УТ2102901263	2022	2025	7,000.0	22,672.5	22,672.5	223.9%	15,672.6
117	XVIII.1.42	Орон сууцжуулах төслийн дэд бүтэц /Баянхонгор, Баацагаан сум/	УТ2102900143	2022	2025	2,300.0	9,663.9	9,663.9	320.2%	4,686.6
118	XVIII.1.44	Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл /Улсын хэмжээнд/	УТ2102901140	2022	2025	45,900.0	61,830.7	57,839.5	26.0%	17,330.6
119	XVIII.1.45	Инженерийн шугам сүлжээ бүхий гэр хорооллын төсөл /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	УТ2002900066	2021	2025	2,300.0	16,877.0	16,877.0	633.8%	5,000.0
120	XVIII.1.46	Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	УТ2002900230	2020	2026	13,200.0	23,896.7	23,896.7	81.0%	3,278.6
121	XVIII.1.47	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ш800-ийн гол шугамыг Ш1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/ /УБ, СХД/	УТ2302914875	2014	2025	15,640.0	39,655.7	39,655.7	153.6%	15,868.3
122	XVIII.1.48	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц /УБ, СХД/	УТ21029000996	2013	2025	5,000.0	6,459.8	6,459.8	29.2%	1,359.8
123	XVIII.1.49	Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл, сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга /УБ, СХД/	УТ21029000930	2011	2025	2,807.4	8,151.0	7,037.1	150.7%	2,753.4
	XVIII.2	II. Их засвар								

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
124	XVIII.2.1	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадын засвар /УБ, БЗД, 7 дугаар хороо, 2, 30, 31 дүгээр байр/	УТ2102900910	2022	2025	2,100.0	2,694.2	2,694.2	28.3%	594.3
125	XVIII.2.2	Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээний их засвар /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	УТ2102901109	2022	2025	10,000.0	14,494.2	14,494.2	44.9%	4,474.4
	XIX	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД								
	XIX.1	I. Барилга байгууламж								
126	XIX.1.9	"Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт /Ховд, Жаргалант сум/	УТ2101901190	2022	2026	19,250.0	35,943.6	35,943.6	86.7%	10,000.0
127	XIX.1.10	Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих "Бяслаг" төсөл /Хөвсгөл, Цэцэрлэг, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох, Түнэл, Эрдэнэбулган, Тариалан, Арбулаг, Шинэ-Идэр, Төмөрбулаг, Улаан-Уул сум/	УТ2101901248	2022	2025	5,000.0	8,744.4	8,744.4	74.9%	1,898.0
128	XIX.1.11	Цөцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний ферм /Булган, Тэшиг сум/	УТ2101900166	2022	2025	3,000.0	3,695.9	3,695.9	23.2%	715.9
129	XIX.1.13	Бяслагийн үйлдвэр /Хөвсгөл, Жаргалант, Цагаан-Уул, Галт, Тосонцэнгэл, Ренчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр, Рашаант, Их-Уул сум/	УТ2001900007	2021	2025	4,000.0	6,836.9	6,837.0	70.9%	3,219.4
	XX	ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ИННОВАЦ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД								
	XX.1	I. Барилга байгууламж								
130	XX.1.1	Хөдөөгийн алслагдсан багуудын харилцаа холбооны дэд бүтэц /Улсын хэмжээнд/	УТ2406700144	2024	2025	20,000.0	20,000.0	24,425.7	22.1%	14,425.7
	XXI	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД								
	XXI.1	I. Барилга байгууламж								
131	XXI.1.34	Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	УТ2103000093	2022	2025	2,400.0	3,551.7	3,551.7	48.0%	1,151.7
132	XXI.1.35	Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	УТ2103000087	2022	2025	4,500.0	5,535.8	5,535.8	23.0%	1,035.8

Д/д	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төслийн код	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг			Анхны төсөвт өртгөөс өөрчлөгдсөн хувь	2025 онд санхүүжих дүн
						Анхны	Сүүлийн	2025 онд		
133	XXI.1.36	Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж /Ховд, Дарви сум/	УТ2103001135	2022	2025	5,515.0	25,669.7	25,669.7	365.5%	19,794.7
134	XXI.1.37	Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл /Ховд, Үенч сум/	УТ2003000969	2019	2025	21,183.6	26,588.2	26,588.2	25.5%	1,000.0
	XXII	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД								
	XXII.1	I. Барилга байгууламж								
135	XXII.1.28	Вақцины хяналтын лабораторийн барилга /УБ, БЗД/	УТ2102000819	2022	2025	3,500.0	9,371.8	9,371.8	167.8%	6,732.3
136	XXII.1.29	Сэргээн засах эмнэлгийн барилга, 40 ор /Өмнөговь, Даланзадгад сум, 6 дугаар баг/	УТ2102000527	2022	2025	4,692.0	9,356.1	9,356.1	99.4%	1,000.5
137	XXII.1.30	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилга /УБ, ЧД/	УТ2202011658	2022	2025	2,800.0	5,521.4	5,512.0	96.9%	980.1
138	XXII.1.31	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Увс, Давст сум/	УТ2102000707	2022	2025	1,152.2	1,527.3	1,527.3	32.6%	304.3
139	XXII.1.32	Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /УБ, ЧД, 4 дүгээр хороо/	УТ2102000764	2022	2025	16,000.0	19,349.9	19,349.9	20.9%	8,960.2
	XXII.2	II. Их засвар								
140	XXII.2.4	Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг барилгын их засвар /УБ, БЗД/	УТ2402002135	2020	2025	919.6	1,560.5	1,560.6	69.7%	541.0
	XXV	ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА								
	XXV.1	I. Барилга байгууламж								
141	XXV.1.1	Дуургуудийн шүүхийн нэгдсэн байр /УБ, ХУД/	УТ1300500001	2013	2026	15,000.0	75,954.9	75,954.9	406.4%	27,995.3

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

- Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл (<https://d.parliament.mn/tusul/b0e-fc0e9-bfee-4928-befc-17e1c002d9b3>)
- Монгол Улсын 2011-2024 оны төсвийн тухай хуулиуд
- Нээлттэй Нийгэм Форум, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам, Улаанбаатар хот, 2024 он.

Цахим эх үүсвэрүүд:

- www.legalinfo.mn
- <https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1644849964107>
- <https://da.moc.gov.mn/news/2647>
- <https://darkhan.gov.mn/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B/>
- <https://oronzai.mn/n/fvL3KvxApCJ96xJ9hBSg>
- <https://www.tender.gov.mn/mn/bidder/entity/1462246992548>

Боловсруулсан: С.Баттулга
Эдийн засагч



НЭЭЛТТЭЙ
НИЙГЭМ
ФОРУМ

Хаяг: Монгол Улс,
Улаанбаатар хот-14240,
Сүхбаатар дүүрэг,
Жамъян гүний гудамж-5/1

Утас: 976-76113207
Факс: 976-11-324857
Веб: <http://www.forum.mn>
И-мэйл: osf@forum.mn
