

# МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ТУССАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ



Судлаач: Т.Тамир

# Агуулга


- Монгол Улсын 2024 оны төсөвт туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн тойм
- Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд туссан болон батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
- Монгол Улсын 2024 оны төсөвт УИХ-аас нэмж тусгасан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн судалгаа

**Монгол Улсын 2024 оны төсөвт  
туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих  
төслүүдийн тойм**

# Судалгаанд хамруулсан шилжих төслийн Тоо




# Монгол Улсын 2024 оны төсвийн санхүүжилтээр өргөн баригдсан, батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн тоо

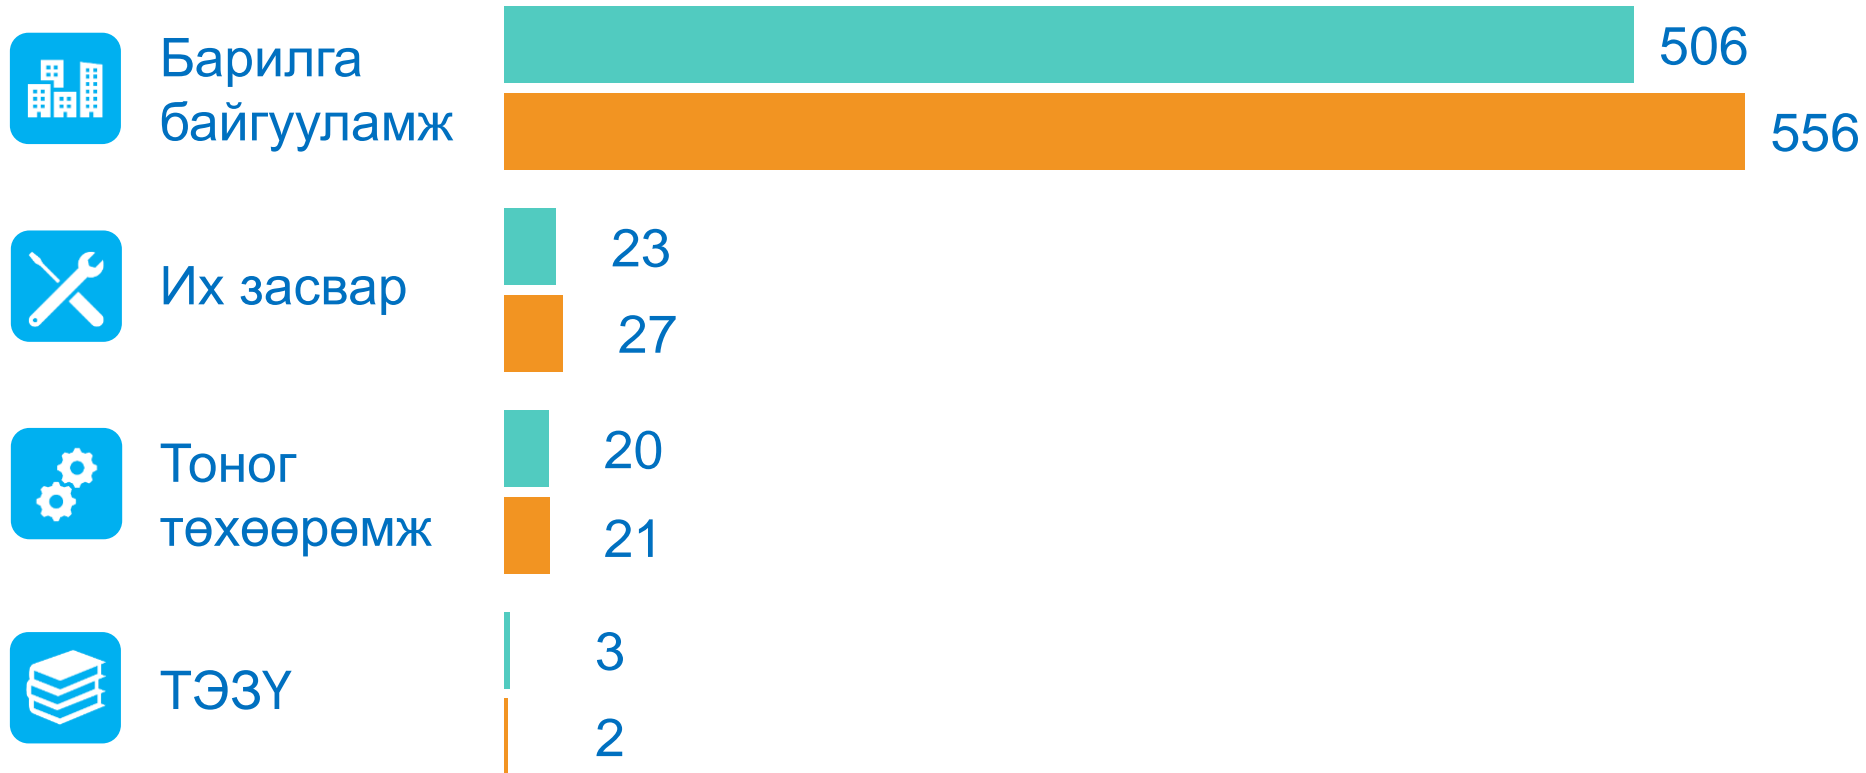

 Төсвийн төсөлд туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тоо

 Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тоо

# Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тоо, аймгаар

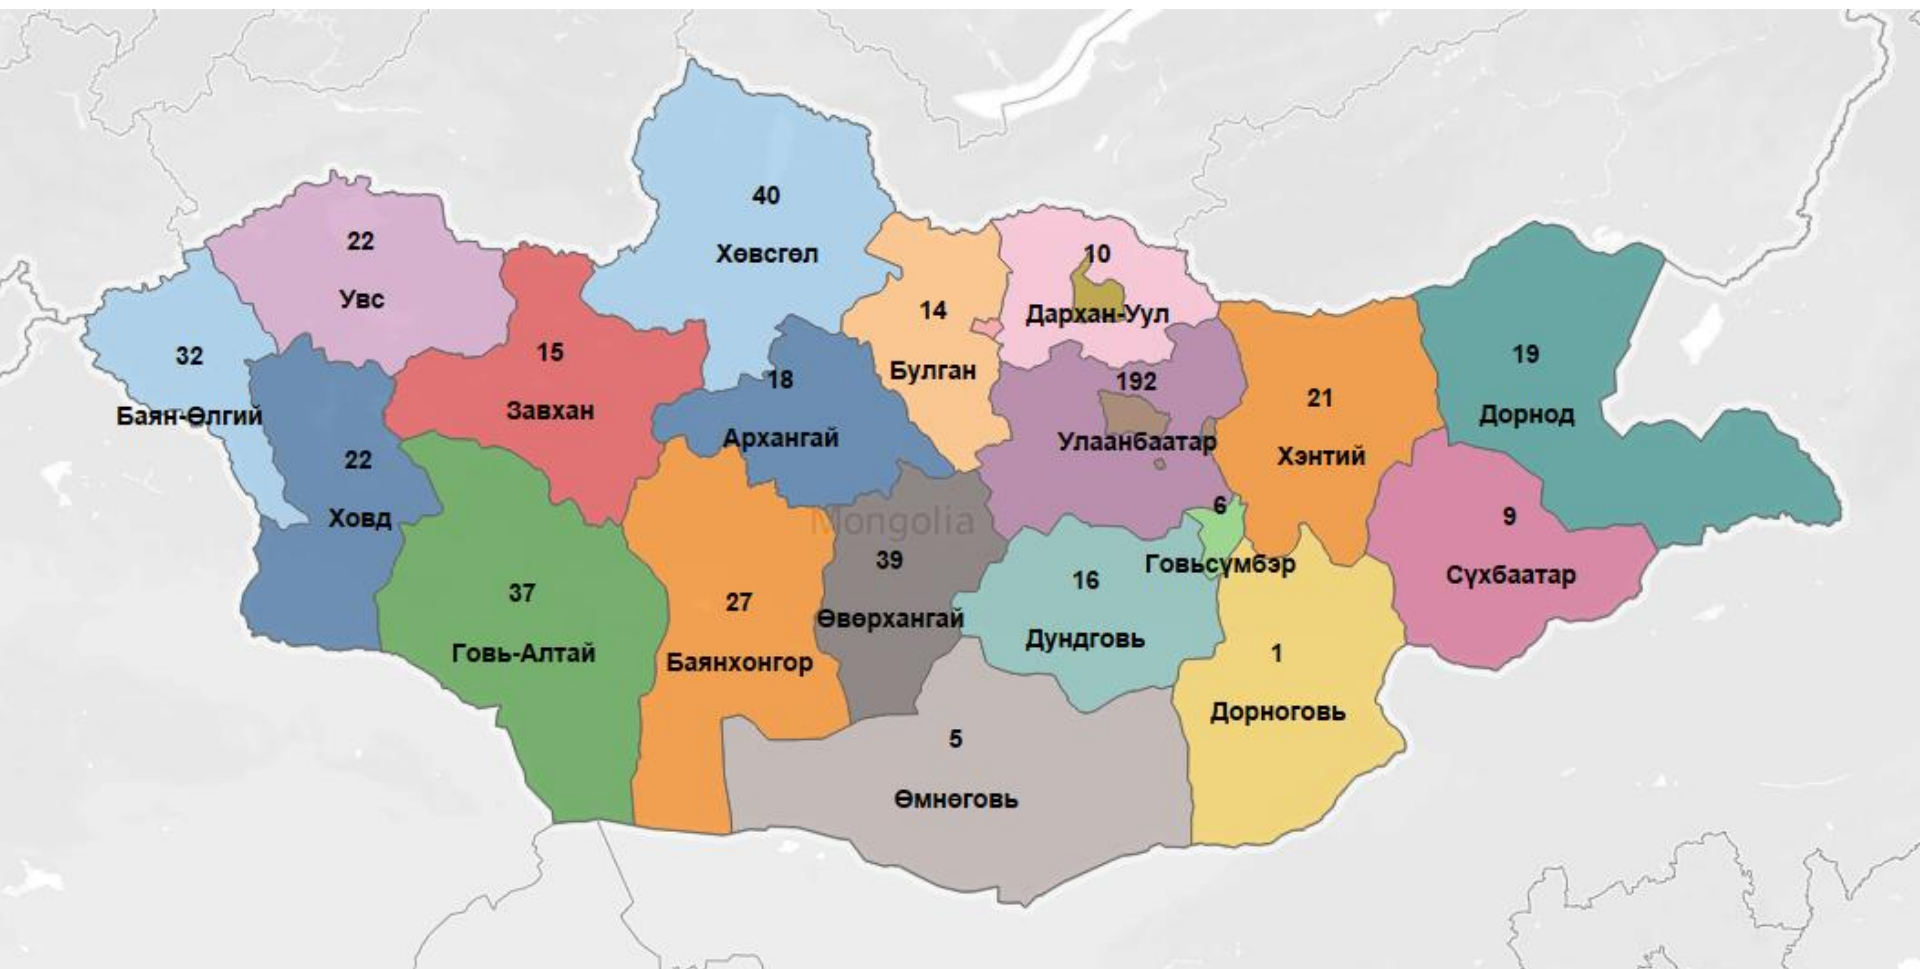

# Анхны өртгөөсөө хамгийн их өөрчлөгдсөн шилжих төсөл

Тэрбум төгрөгөөр

№	Төслийн нэр	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Өөрчлөлт
1	Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт	32.2	114.1	81.9
2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам	114.1	187.0	72.9
3	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км	115.9	185.4	69.5
4	Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр	15.0	75.9	60.9
5	Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор	94.0	154.5	60.5

# Ижил хүчин чадалтай спорт цогцолборын барилгын төсвийн өөрчлөлт (сая төгрөгөөр)

Төслийн нэр	Эхлэх он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2024 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт
Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум, 1 дүгээр сургууль/	2022	1200.0	2175.9	1049.1	975.9
Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум, 2 дугаар сургууль/	2022	1200.0	1795.6	629.7	595.6
Спорт заалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2022	1200.0	1723.2	553.2	523.2



# Ижил хүчин чадалтай ЕБС барилгын төсвийн өөрчлөлт (сая төгрөгөөр)


Төслийн нэр	Эхлэх он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2024 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт
Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баянхонгор, Баянцагаан сум/	2019	3432.9	9534.6	100.0	6101.7
Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Цахир сум/	2019	3200.0	7082.6	1706.9	3882.6
Сургуулийн барилга, 320 суудал /Өмнөговь, Цогт-Овоо сум/	2019	3500.0	4664.3	542.3	1164.3
Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/	2019	3500.0	4592.9	407.8	1092.9
Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2019	3700.0	4050.5	1384.6	350.5

# Ижил хүчин чадалтай авто замын төсвийн өөрчлөлт (сая төгрөгөөр)

Төслийн нэр	Эхлэх он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2024 онд санхүүжих дүн	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, <b>124.5</b> км /Дорнод/	2022	114044.9	187003.4	27500.0	72958.5
Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, <b>122.4</b> км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	115862.7	185396.8	30886.3	69534.1
Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, <b>130</b> км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	109129.0	151859.4	31762.1	42730.4
Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, <b>50</b> км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	49820.0	84892.6	20892.6	35072.6
Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, <b>49</b> км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	51600.0	67941.3	18000.0	16341.3

**Монгол Улсын 2024 оны төсөвт  
УИХ-аас нэмж тусгасан хөрөнгө  
оруулалтын шилжих төслүүдийн  
судалгаа**

# УИХ-аас нэмж баталсан шилжих төслийн тоо, байршлаар

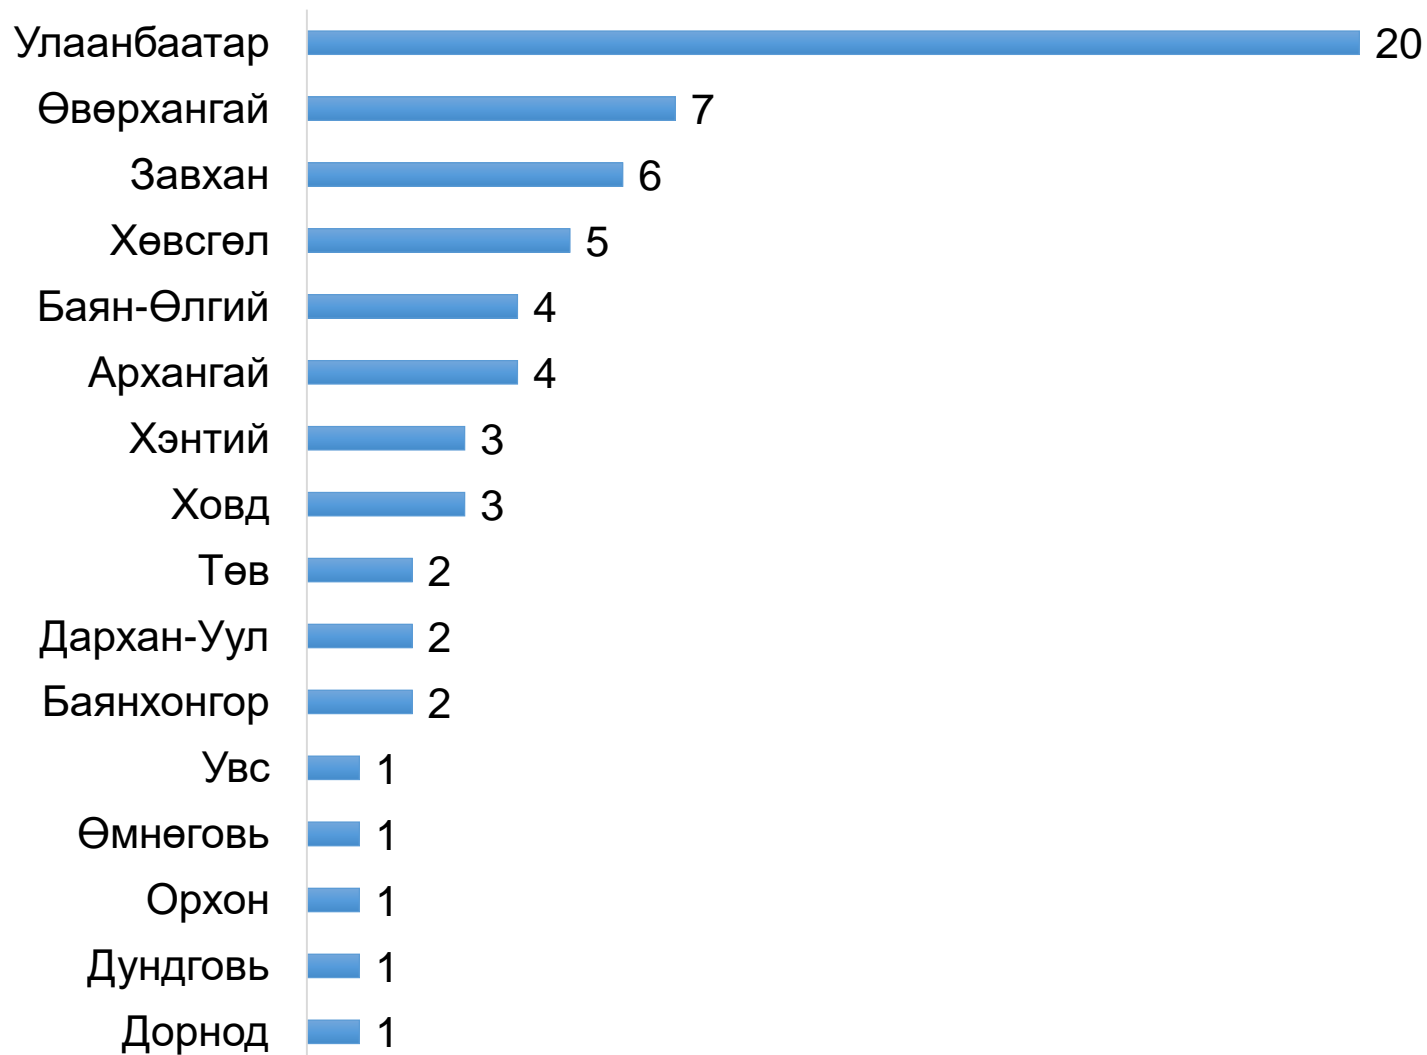

# УИХ-аас нэмж баталсан 63 шилжих төслийн эхэлсэн он



# УИХ-аас нэмж баталсан 63 шилжих төслөөс хамгийн их төсвийн өөрчлөлттэй төсөл

- Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр  
/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/
  - Анхны төсөвт өртөг: **15.0** тэрбум
  - 2024 оны төсөвт өртөг: **75.9** тэрбум
  - Төслийн өөрчлөлт: **60.9** тэрбум
  - 2024 онд санхүүжүүлэх дүн: **5.0** тэрбум
  - Эхэлсэн он: 2013
  - Дуусах он: 2026

# 2024 оны төсвийн тухай хуульд тусгаагүй 9 шилжих төсөл (тэрбум төгрөг)

Төслийн нэр	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	2018	2.8	6.7
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	2021	1.0	0.7
Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор	2021	0.2	0.6
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	2021	1.0	0.6
Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга	2022	2.1	0.4
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	2022	0.3	0.2
Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил	2022	7.0	0.0
Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл	2022	5.0	0.0
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр	2022	3.6	-2.2

# Дүгнэлт

- Ижил нөхцөлтэй шилжих төслүүд ялгаатай дүнгээр 2024 оны төсөвт өртөг нь анхны төсөвт өртгөөсөө өссөн.
- Хамгийн олон төсөлтэй БСШУС-ын дийлэнх төсөл нь сургууль, цэцэрлэгийн барилга байна.
- Нийт 606 төслийн хамгийн эрт нь 2010 онд эхэлсэн, 2015 оноос өмнө эхэлсэн 18 төсөл байгаа тул эдгээр төслийг дуусгах шаардлагатай.



**Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!**

