




# МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ТУССАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

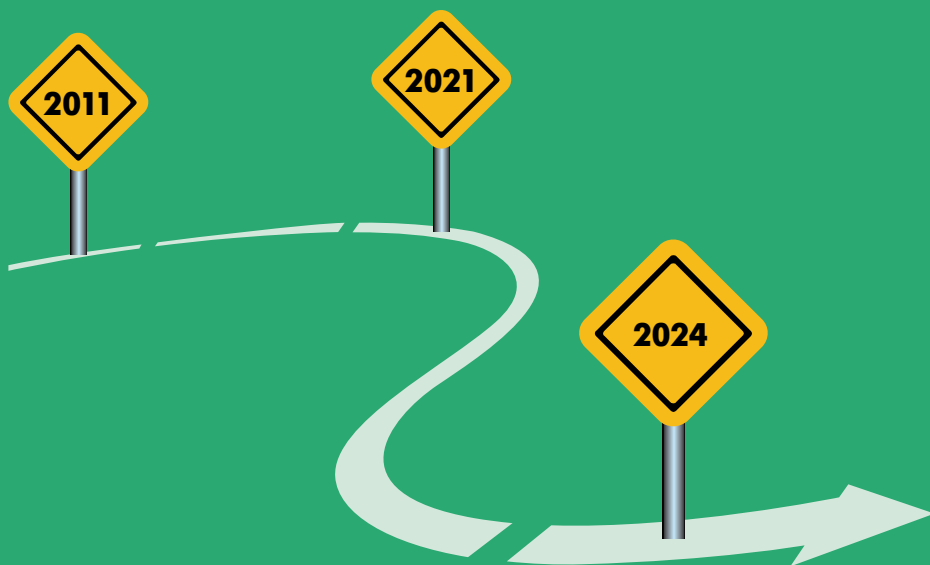

Улаанбаатар хот  
2024 он

ННА 65  
ДАА 330  
Т-204

## МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ТУССАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

### Боловсруулсан:

Т.Тамир (ШУТИС-ийн багш, Бизнесийн удирдлагын магистр)

© Нээлттэй Нийгэм Форум, 2024

Хаяг: Жамьян гүний гудамж  
Сүхбаатар дүүрэг  
Улаанбаатар 14240  
Утас: 76113207  
Веб: <http://www.forum.mn>  
И-мэйл: [osf@forum.mn](mailto:osf@forum.mn)

Энэхүү шинжилгээний дүгнэлт нь уг шинжилгээг хийсэн судлаачийн үзэл бодол, байр суурь бөгөөд Нээлттэй Нийгэм Форумын албан ёсны байр суурийг төлөөлөхгүй.

ISBN 978-9919-9083-8-6

## АГУУЛГА

ОРШИЛ .....	5
НЭГ. Монгол Улсын 2024 оны төсөвт туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн тойм .....	5
ХОЁР. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд туссан болон батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар .....	10
ГУРАВ. Монгол Улсын 2024 оны төсөвт УИХ-аас нэмж тусгасан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн судалгаа .....	15
ДҮГНЭЛТ .....	23
АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ .....	24
Хавсралт 1. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын 63 шилжих төсөл .....	25
Хавсралт 2. Монгол Улсын төсвийн төсөлд туссан боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд тусаагүй хөрөнгө оруулалтын 9 шилжих төслийн мэдээлэл.....	31
Хавсралт 3. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн анхны төсөвт өртөг ба 2024 оны төсөвт өртгийн харьцуулалт.....	32

## ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Монгол Улсын 2024 оны улсын төсвөөр санхүүжүүлэхээр өргөн баригдсан болон батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тооны харьцуулалт .....	6
Зураг 2. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн тоо, байршлаар.....	7
Зураг 3. Улсын төсвийн санхүүжилтээр 2024 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн төсвийн төсөлд туссан болон батлагдсан төсөвт өртгийн харьцуулалт, төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар (тэрбум төгрөг) .	12
Зураг 4. Монгол Улсын 2024 оны төсөвт УИХ-аас нэмж баталсан шилжих төслийн тоо, байршлаар .....	15
Зураг 5. Монгол Улсын төсвийн санхүүжилтээр 2024 онд санхүүжүүлэх шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тоо, төсөл эхэлсэн он .....	22

## ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэх шилжих төслүүд, байршлаар .....	7
Хүснэгт 2. Монгол Улсын төсвөөр 2024 онд улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд .....	9
Хүснэгт 3. Улсын төсвийн санхүүжилтээр 2024 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар харьцуулсан байдал.....	10
Хүснэгт 4. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх шилжих төслүүдийн төрөл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар .....	13
Хүснэгт 5. 2024 оны улсын төсвийг батлахдаа УИХ-аас нэмсэн Улаанбаатар хотод байршилтай шилжих төслүүд.....	16
Хүснэгт 6. 2024 оны улсын төсвийг батлахдаа УИХ-аас нэмсэн Өвөрхангай, Завхан аймгуудад байршилтай шилжих төслүүд.....	19
Хүснэгт 7. 2024 оны төсвийн төсөлд туссан боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд тусаагүй хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд .....	21

## ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

БОАЖС	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
БХБС	Барилга, хот байгуулалтын сайд
БШУС	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
ЗТХС	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
МУСЗГХЭГД	Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга
МУСОНБТСҮХД	Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын үндэсний хорооны дарга
ТЭЗҮ	Техник, эдийн засгийн үндэслэл
ХЗДХС	Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
ХНХС	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
ХХААХҮС	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
ШЕЗ	Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
ЭМС	Эрүүл мэндийн сайд
ЭХС	Эрчим хүчний сайд

## ОРШИЛ


Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль 2023 оны 11 дүгээр сард батлагдан, 12 дугаар сард ил болсон. Энэхүү судалгаагаар 2024 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн төлөвлөлтийг авч үзлээ. Энэ хүрээнд Засгийн газраас 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-нд Улсын Их Хурал (УИХ)-д өргөн барьсан 2024 оны төсвийн төсөлд туссан болон батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн өөрчлөлтийг судаллаа. Судалгаанд 2024 оны төсвийн төсөлд туссан 552, 2024 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтад батлагдсан 606 шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийг хамрууллаа.

## НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСӨВТ ТУССАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ТОЙМ

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд туссан нийт 1049 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 52.6 хувь буюу 552 нь шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж байсан. Эдгээрийн 2024 оны төсөвт өртөг 5.1 их наяд төгрөг, 2024 онд санхүүжүүлэх дүн 1.58 их наяд төгрөг байсан. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд 552 шилжих төсөл туссан бол төслийн тухай Монгол Улсын хуульд 63 шилжих төсөл (Хавсралт 1) нэмэгдэж, 9 шилжих төсөл (Хавсралт 2) хасагдсантай холбоотойгоор нийт 606 шилжих төсөл батлагджээ. Эдгээрийн 2024 оны нийт төсөвт өртөг 5.6 их наяд төгрөг, 2024 онд санхүүжүүлэх дүн 1.52 их наяд төгрөг байна. Төслүүдийн нийт төсөвт өртөг 500 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ.

Төсвийн төсөлтэй харьцуулахад барилга байгууламж 50 шилжих төслөөр, их засвар 4 шилжих төслөөр, тоног төхөөрөмж 1 шилжих төслөөр тус тус өссөн бол техник, эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) 1 шилжих төслөөр буурч батлагдсан байна (Зураг 1).

## ЗУРАГ 1. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭР ӨРГӨН БАРИГДСАН БОЛОН БАТЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН ТООНЫ ХАРЬЦУУЛАЛТ

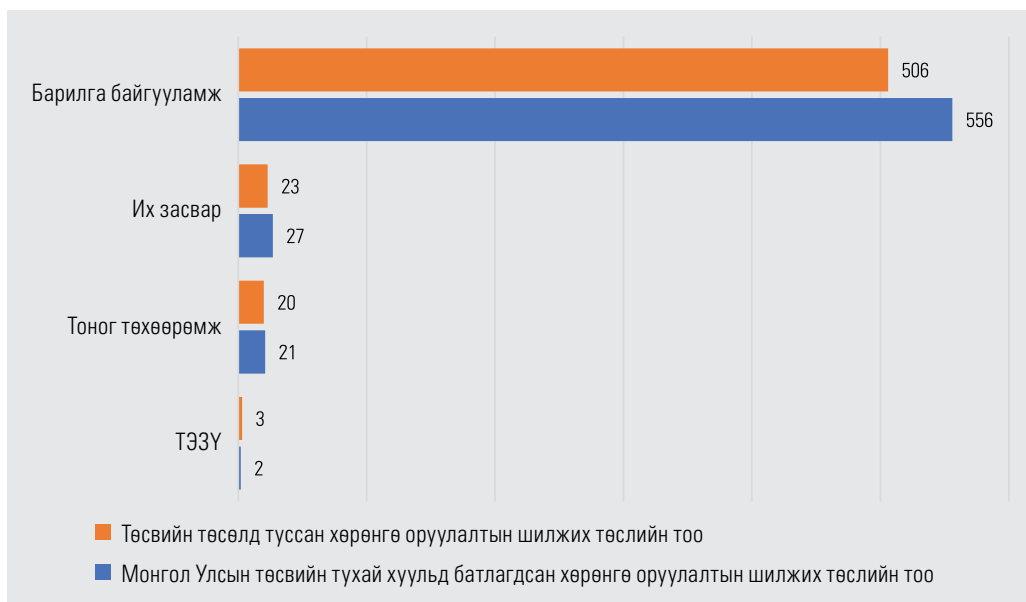

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөл

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан, хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн 91.7 хувийг барилга, байгууламж, 4.2 хувийг их засвар, 3.6 хувийг тоног төхөөрөмж, 0.5 хувийг ТЭЗҮ эзэлж байна (Зураг 1).

Хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийг байршлаар нь авч үзвэл Улаанбаатар хотод хамгийн олон буюу 192 төслийг санхүүжүүлж байгаа бол Дорноговь аймагт хамгийн бага буюу 1 төслийг санхүүжүүлж байна (Зураг 2). Дорноговь аймагт байршилтай 700 хүний суудалтай театрын барилгын төсөл 2021 онд эхэлсэн, 9.5 тэрбум төгрөгийн анхны төсөвт өртөгтэй байсан бол 2024 оны төсөвт өртөг нь 18.5 тэрбум төгрөг болж өсжээ. Уг төсөлд 2024 онд 7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгохоор төлөвлөжээ.

## ЗУРАГ 2. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2024 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН ТОО, БАЙРШЛААР



Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Улаанбаатар хотод хамгийн олон төсөл буюу 192 шилжих төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцад 97 төсөл, Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад 34 төсөл, Эрүүл мэндийн сайдын багцад 16 төслийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Харин Дорноговь аймагт хамгийн бага буюу 1 төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь Соёлын сайдын багц дахь 700 суудалтай “Саран хөхөө” театрын барилга байна (Хүснэгт 1).

### ХҮСНЭГТ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2024 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД, БАЙРШЛААР (ТЭРБУМ ТӨГРӨГ)

Байршил	Төслийн тоо	2024 оны төсөвт туссан төсөвт өртөг	2024 онд олгох санхүүжилт
Улаанбаатар	192	1,893.9	460.6
Төв	23	542.3	118.8
Хэнтий	21	442.5	121.6
Дорнод	19	430.1	103.5
Улсын хэмжээнд	11	355.5	102.4

Хүснэгт 1-ийн үргэлжлэл

Байршил	Төслийн тоо	2024 оны төсөвт туссан төсөвт өртөг	2024 онд олгох санхүүжилт
Хөвсгөл	40	216.2	79.3
Ховд	22	211.6	67.1
Архангай	18	201.4	55.0
Өвөрхангай	39	176.4	55.2
Баянхонгор	27	174.7	54.7
Баян-Өлгий	32	162.2	47.9
Дархан-Уул	10	141.2	25.0
Говь-Алтай	37	126.3	52.3
Увс	22	91.7	34.5
Дундговь	16	77.6	22.3
Булган	14	74.4	32.2
Сэлэнгэ	18	70.3	23.5
Завхан	15	61.2	22.2
Орхон	9	49.7	12.2
Сүхбаатар	9	34.9	10.9
Говьсүмбэр	6	28.6	9.3
Өмнөговь	5	23.9	5.4
Дорноговь	1	18.5	7.0

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Улаанбаатар хотоос гадна, хамгийн олон төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжтай, хамгийн өндөр төсөвт өртөг, санхүүжилттэй аймгуудыг Төв, Хэнтий, Дорнод, Хөвсгөл, Ховд, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Говь-Алтай, Увс аймгууд тэргүүлж байна (Хүснэгт 1). Үүнээс гадна, “Улсын хэмжээнд” гэсэн тодотголтой буюу байршил тодорхойгүй 11 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж байна.



ХҮСНЭГТ 2. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВӨӨР 2024 ОНД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД (ТЭРБУМ ТӨГРӨГ)

№	Төслийн нэр	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	2024 онд санхүүжүүлэх дүн
1	САНГИЙН САЙД: Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт	32.2	114.1	14.5
2	БХБС: Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд баригдах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц	100.0	109.8	42.7
3	БХБС: Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл	45.9	61.8	20.4
4	ХЗДХС: Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженерийн байгууламжийн шинэчлэлт	17.3	18.3	4.0
5	САНГИЙН САЙД: Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах	8.0	18.0	5.3
6	ЭХС: Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж, шугам сүлжээ, дэд станц	12.0	11.8	6.4
7	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР: Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга	7.9	10.3	1.7
8	МУСЗГХЭГД: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар	0.5	6.5	6.5
9	БХБС: Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт	35.0	4.1	0.4
10	МУСЗГХЭГД: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж	0.4	0.4	0.4
11	БХБС: Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт	15.0	0.2	0.1
<b>Дүн</b>		<b>274.3</b>	<b>355.3</b>	<b>102.4</b>

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын шилжих төслийн 2024 оны төсөвт өртгийн 37.1 хувь нь Сангийн сайдын багцад, 49.5 хувь Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад, 13.4 хувь нь бусад төслийн ерөнхийлөн захирагч нарт хамаарч байна (Хүснэгт 2).

## ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУССАН БОЛОН БАТЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР

Монгол Улсын 2024 оны төсвөөс санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 2024 оны төсөвт өртгийн 25 хувь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдад, 21.6 хувь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад, 12.9 хувь Барилга, хот байгуулалтын сайдад, 7.6 хувь Эрчим хүчний сайдад, 7.4 хувь Соёлын сайдад, үлдсэн 18.9 хувь бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт оногдож байна (Хүснэгт 3).

### ХҮСНЭГТ 3. УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙГ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ (ТЭРБУМ ТӨГРӨГ)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төслийн тоо	2024 оны төсөвт өртөг	Нийт төсөвт өртөгт эзлэх хувь	2024 онд санхүүжих дүн
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд	269	1403.8	25.05%	414.4
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд	40	1215.2	21.68%	255.8
Барилга, хот байгуулалтын сайд	81	721.4	12.87%	263.3
Эрчим хүчний сайд	20	428.6	7.65%	139.1
Соёлын сайд	42	413.3	7.37%	95.5
Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар, хотын автозамын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга	2	362.9	6.48%	56.2
Эрүүл мэндийн сайд	48	291.9	5.21%	115.8
Монгол Улсын сайд, олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын үндэсний хорооны дарга	24	179.1	3.19%	38.2
Сангийн сайд	4	150.2	2.68%	23.5
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд	26	122.7	2.19%	38.3
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл	1	76.0	1.36%	5.0
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд	13	69.5	1.24%	19.4

Хүснэгт 3-ын үргэлжлэл


Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төслийн тоо	2024 оны төсөвт өртөг	Нийт төсөвт өртөгт эзлэх хувь	2024 онд санхүүжих дүн
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга	14	55.4	0.99%	26.2
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд	10	52.9	0.94%	17.9
Улсын ерөнхий прокурор	2	16.0	0.29%	1.8
Монгол Улсын шадар сайд бөгөөд эдийн засаг, хөгжлийн сайд	1	15.3	0.27%	4.0
Монгол Улсын шадар сайд	1	12.5	0.22%	3.6
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд	3	10.3	0.18%	3.4
Батлан хамгаалахын сайд	3	6.0	0.11%	0.9
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд	2	2.1	0.04%	0.7
<b>Нийт</b>	<b>606</b>	<b>5605.1</b>	<b>100%</b>	<b>1523.1</b>

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцад хамгийн их буюу 1.4 их наяд төгрөгийн төсөвт өртөгтэй шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж оногдож байна (Зураг 3). Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багц дахь шилжих төслийн төсөвт өртөг 1.2 их наяд төгрөг, Барилга хот байгуулалтын сайдын багц дахь шилжих төслийн төсөвт өртөг 0.7 их наяд төгрөг байна.

2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 2024 оны төсөвт өртөг төсвийн төсөлд туссан дүнгээс өссөн байна (Зураг 3). Хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн нийт төсөвт өртгийн дүнгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд тэргүүлж буй бөгөөд 269 төслийн 251 нь сургууль, цэцэрлэгийн барилга барих, засварлах төсөл байна (Хүснэгт 4).

ЗУРАГ 3. УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУССАН БОЛОН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР (ТЭРБУМ ТӨГРӨГ)

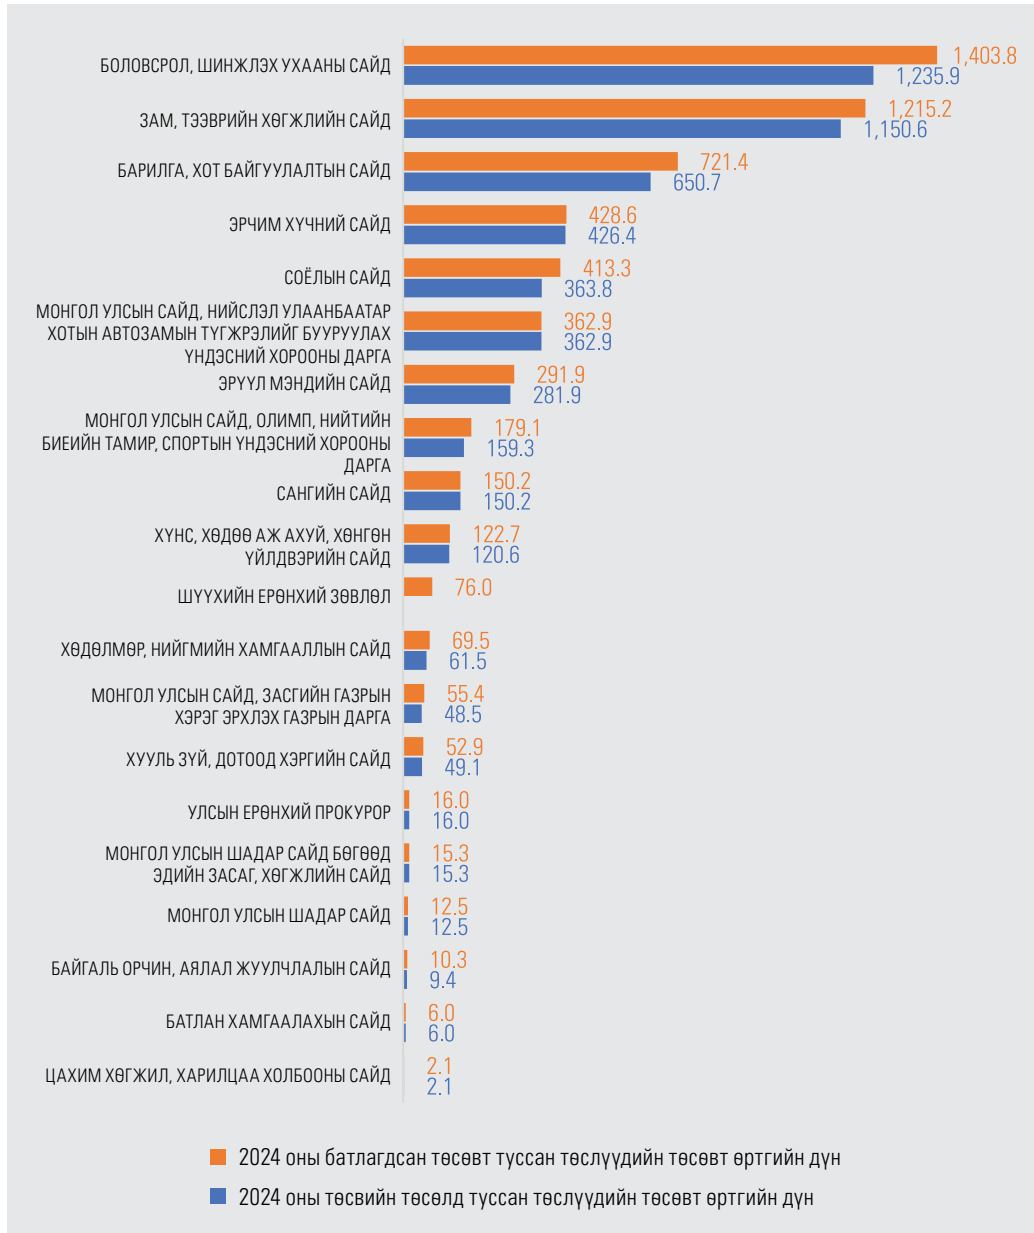

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

ХҮСНЭГТ 4. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН ТӨРӨЛ, ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн төрөл	Төслийн тоо
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд	Бага сургууль, дотуур байр, ерөнхий боловсролын сургууль, их сургууль, сургуулийн автобус, цэцэрлэг	251
	Багшийн хөгжлийн төв, боловсролын төв, лаборатори	6
	Хүүхдийн зуслан, спорт цогцолбор, тусгай үйлчилгээ	8
	Дэд бүтэц	4
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд	Авто зам, нисэх буудал	38
	Дэд бүтэц	1
	Төрийн үйлчилгээг сайжруулах	1
Барилга, хот байгуулалтын сайд	Гудамж, орон сууц, сум, хүүхдийн тоглоомын талбай, явган хүний замын тохижилт	27
	Дэд бүтэц	48
	Лаборатори, сүм хийд, төрийн үйлчилгээг сайжруулах	6
Эрчим хүчний сайд	Дэд бүтэц	15
	Станц, үйлдвэр, зэвсэгт хүчин	5
Соёлын сайд	Ахмадын төв	1
	Музей, номын сан, соёл урлаг	40
	Спорт цогцолбор	1
Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын автозамын түгжрэлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга	Засаг захиргааны нэгж	1
	Нийтийн тээвэр	1
Эрүүл мэндийн сайд	Ерөнхий боловсролын сургууль	1
	Лаборатори, нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв	47
Монгол Улсын сайд, олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын үндэсний хорооны дарга	Спорт цогцолбор	24
Сангийн сайд	Дэд бүтэц	1
	Тусгай үйлчилгээ	3
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд	Ахуйн үйлчилгээний төв	1
	Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, лаборатори, тариаланг дэмжих, үйлдвэр, үйлдвэр технологийн парк	25

Хүснэгт 4-ийн үргэлжлэл

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч	Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн төрөл	Төслийн тоо
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл	Төрийн үйлчилгээг сайжруулах	1
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд	Ахмадын төв, сувилал, спорт цогцолбор	8
	Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв	2
	Төрийн үйлчилгээ, тусгай үйлчилгээг сайжруулах	3
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга	Засаг захиргааны нэгж	11
	Их сургууль	1
	Төрийн үйлчилгээг сайжруулах	2
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд	Дэд бүтэц	1
	Зэвсэгт хүчний анги тохижилт	2
	Төрийн үйлчилгээ, тусгай үйлчилгээг сайжруулах	7
Улсын ерөнхий прокурор	Тусгай үйлчилгээг сайжруулах	2
Монгол Улсын шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд	Дэд бүтэц	1
Монгол Улсын шадар сайд	Тусгай үйлчилгээг сайжруулах	1
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд	Дэд бүтэц, лаборатори, Музей	3
Батлан хамгаалахын сайд	Зэвсэгт хүчин	3
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд	Дэд бүтэц	2
<b>Нийт</b>		<b>606</b>


Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Зам, тээврийн сайдын багцын 40 төслийн 38 нь авто зам, нисэх буудлын төсөл, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 81 төслийн 48 нь дэд бүтцийн төсөл, Эрчим хүчний сайдын 20 төслийн 15 нь дэд бүтцийн төсөл, Соёлын сайдын 42 төслийн 40 нь музей, номын сан, соёл урлагийн байгууллагын барилгын төсөл байна (Хүснэгт 4).

## ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСӨВТ УИХ-ААС НЭМЖ ТУСГАСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН СУДАЛГАА

Төсвийн төсөлд туссан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт дээр УИХ-аас 63 шилжих төсөл нэмж (Хавсралт 1), 9 төсөл хасаж баталсан байна (Хавсралт 2). Эдгээр 63 төсөл нь нийт 416.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй бөгөөд 2024 онд санхүүжих дүн 39.6 тэрбум төгрөг байна. Ийнхүү өмнөх онуудад эхэлсэн 60 гаруй шилжих төслийг Засгийн газраас төсвийн төсөлд тусгаагүй орхигдуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 27.6 дахь “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө дараах эрэмбийг баримтална: (i) шилжих буюу он дамжин хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээ; (ii) их засвар, засвар арчлалтын төсөл, арга хэмжээ; (iii) шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлээгүйг харуулж байна. Өмнөх онуудад эхэлсэн төслүүдэд шаардагдах санхүүжилтийг хуваарилахгүй байх нь төслийн хэрэгжилт удаашрах эрсдэл дагуулах юм.

ЗУРАГ 4. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСӨВТ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН ТОО, БАЙРШЛААР

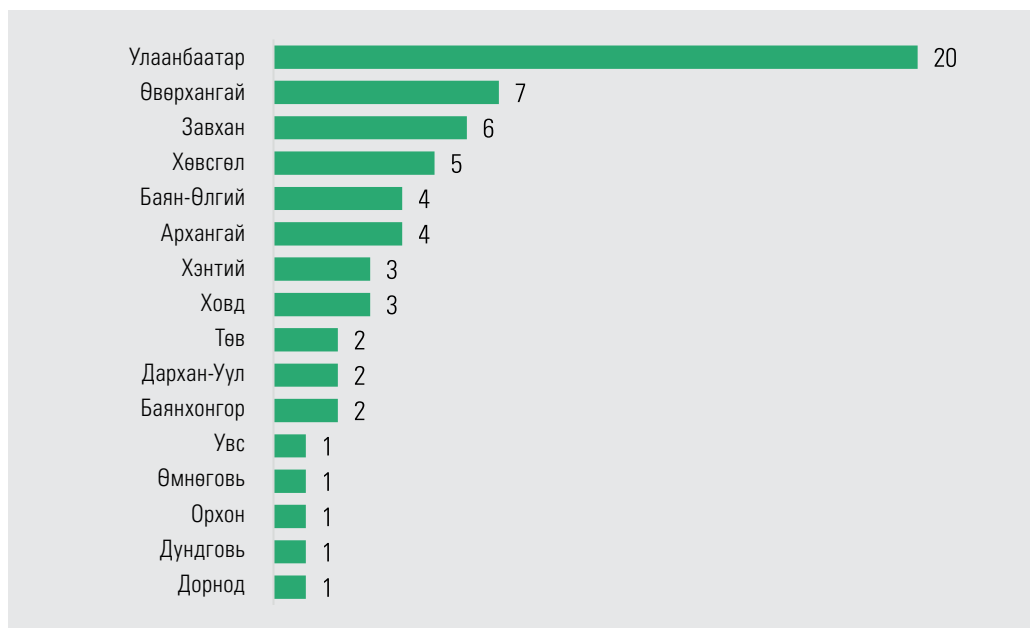

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

УИХ-аас нэмсэн шилжих төслийн тоогоор Улаанбаатар хот тэргүүлж, Өвөрхангай, Завхан аймгууд удаалж байна (Зураг 4). Тухайлбал, Улаанбаатар хотод дараах 20 шилжих төслийг нэмжээ (Хүснэгт 5). Эдгээрийн дотор 10 гаруй жилийн өмнө эхэлсэн төсөл ч байна. Жишээлбэл, БХБС-ийн багц дахь Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлалтай Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл, сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга нь 2011 онд эхэлсэн бөгөөд 2.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр анх батлагдаж байжээ. Уг төслийн төсөвт өртөг 2024 оны төсвийн тухай хуулиар 8.2 тэрбум төгрөг байхаар батлагдсан нь анхны төсөвт өртгөөсөө 5.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

Ийнхүү хэрэгжилт нь удааширсан төслүүдийн төсөвт өртөг ихээхэн нэмэгджээ. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт байршилтай Үндэсний номын сангийн барилга 2012 онд эхэлсэн бөгөөд анхны төсөвт өртөг 12 тэрбум төгрөг байсан бол 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг 26 тэрбум төгрөг болж 13.7 тэрбум төгрөгөөр өсжээ.

#### ХҮСНЭГТ 5. 2024 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙГ БАТЛАХДАА УИХ-ААС НЭМСЭН УЛААНБААТАР ХОТОД БАЙРШИЛТАЙ ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД (ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР)

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч / Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	
						Мөнгөн дүнгээр	Хувиар
1	ШЕЗ: Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр	УБ ХУД	2013	15.0	76.0	61.0	407%
2	СОЁЛЫН САЙД: Үндэсний номын сангийн барилга	УБ СБД	2012	12.0	25.7	13.7	114%
3	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	УБ СХД	2018	2.8	9.5	6.7	239%
4	БХБС: Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл, сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга	УБ СХД	2011	2.8	8.1	5.3	189%
5	ХНХС: Ахмадын сувиллын барилга	УБ НД	2022	2.6	6.8	4.2	162%



Хүснэгт 5-ын үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч / Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	
						Мөнгөн дүнгээр	Хувиар
6	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ ЧД	2022	2.9	6.9	4.0	138%
7	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ ЧД	2022	2.9	6.7	3.8	131%
8	БХБС: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны шинэчлэл	УБ НД	2022	5.0	8.4	3.4	68%
9	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ СХД	2020	3.5	6.7	3.2	91%
10	МУСЗГХЭГД: Хорооны барилга	УБ СХД	2022	2.0	4.8	2.8	140%
11	БШУС: Сургуулийн барилга, 960 суудал	УБ БЗД	2019	6.5	8.7	2.2	34%
12	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ БЗД	2022	3.6	5.3	1.7	47%
13	БХБС: Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц	УБ СХД	2013	5.0	6.5	1.5	30%
14	БШУС: Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор	УБ БЗД	2020	2.5	3.8	1.3	52%
15	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ ХУД	2022	4.6	5.8	1.2	26%
16	ЭМС: Эрүүл мэндийн салбарын их засвар-Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг барилгын их засвар	УБ БЗД	2020	0.9	1.6	0.7	78%

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч / Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	
						Мөнгөн дүнгээр	Хувиар
17	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	УБ БГД	2022	2.0	2.4	0.4	20%
18	ХНХС: Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга	УБ БН	2022	0.9	1.2	0.3	33%
19	БШУС: Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж	УБ ЧД	2022	1.0	1.3	0.3	30%
20	БШУС: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тоног төхөөрөмж	УБ БЗД	2022	2.2	2.2	0.0	0%

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Өвөрхангай, Завхан аймгуудад байршилтай нийт 13 шилжих төслийг УИХ нэмж баталсан байна (Хүснэгт 6). Эдгээрээс хамгийн олон жил үргэлжилж буй төсөл нь 2019 онд эхэлсэн Соёлын сайдын багц дахь 200 суудалтай соёлын төвийн барилгын төсөл, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцад хамаарах, Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын төсөл байна. Эхний төсөл 1.2 тэрбум, хоёрдох төсөл 1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр анх батлагдаж байжээ. Эдгээр төслийн төсөвт өртөг 2024 оны төсвийн тухай хуулиар 2.1, 1.5 тэрбум төгрөг байхаар тус тус батлагдсан нь анхны төсөвт өртгөөсөө 0.9, 0.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

ХҮСНЭГТ 6. 2024 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙГ БАТЛАХДАА УИХ-ААС НЭМСЭН ӨВӨРХАНГАЙ, ЗАВХАН АЙМГУУДАД БАЙРШИЛТАЙ ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД (ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР)

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/ Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Өвөрхангай, Арвайхээр сум	2022	7.4	6.9	-0.5	-7%
2	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор	Завхан, Яруу сум	2022	1.9	3.1	1.2	63%
3	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга	Завхан, Тосонцэнгэл сум	2020	1.5	2.7	1.2	80%
4	БХБС: Үерийн далан	Өвөрхангай, Хархорин сум	2022	2.0	2.6	0.6	30%
5	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан, Отгон сум	2022	1.7	2.2	0.5	29%
6	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан, Цагаанхайрхан сум	2022	1.2	2.1	0.9	75%
7	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 200 суудал	Завхан, Түдэвтэй сум	2019	1.2	2.1	0.9	75%
8	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хужирт сум	2021	1.0	1.7	0.7	70%
9	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Богд сум	2021	1.0	1.6	0.6	60%

Хүснэгт 6-ын үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/ Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
10	МУСЗГХЭГД: Засаг даргын Тамгын газрын барилга	Өвөрхангай, Тарагт сум	2019	1.0	1.5	0.5	50%
11	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан, Цагаанчулуут сум	2020	1.1	1.4	0.3	27%
12	БОАЖС: Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн барилга	Өвөрхангай, Хужирт сум	2022	0.4	0.6	0.2	50%
13	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум	2022	0.3	0.5	0.2	67%

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд тусгагдаагүй боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд нэмэгдсэн 63 (Хавсралт 1) шилжих төслийг төрлөөр нь авч үзвэл, зам, гүүрний 2 төсөл, ахмадын төв, сувиллын барилгын 2 төсөл, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгын 26 төсөл, дэд бүтцийн 4 төсөл, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, хорооны барилга, тоног төхөөрөмжийн 4 төсөл, лабораторийн барилгын 2 төсөл, аймаг, дүүргийн шүүх, цагдаагийн газрын барилгын 2 төсөл, соёлын төвийн барилгын 5 төсөл, эрүүл мэндийн төвийн барилгын 9 төсөл байгаагаас гадна Ховд аймгийн музейн барилгын төсөл, Баян-Өлгий аймгийн нисэх буудлын барилгын төсөл, үндэсний номын сангийн барилгын төсөл, Улсын II төв эмнэлгийн барилгын төсөл, Налайх дүүрэг дэх, ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны шинэчлэх төсөл, Баянхонгор, Төв аймгуудад барих спорт цогцолборын барилгын төслүүд байна.

ХҮСНЭГТ 7. 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУССАН БОЛОВЧ 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН  
ТУХАЙ ХУУЛЬД ТУСААГҮЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮД  
(ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн төсөлд туссан төсөвт өртөг
1	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	УБ, СХД	2018	2.8	9.5
2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хужирт сум	2021	1.0	1.7
3	Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор	Баян- Өлгий, Ногооннуур сум	2021	0.2	0.8
4	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Богд сум	2021	1.0	1.6
5	Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга	Баян-Өлгий, Өлгий сум	2022	2.1	2.5
6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум	2022	0.3	0.5
7	Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил	Хөвсгөл, Мөрөн сум	2022	7.0	7.0
8	“Эрдэнэт” шинжлэх ухаан технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл	Орхон, Баян-Өндөр сум	2022	5.0	5.0
9	Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр	Хөвсгөл, Ховд	2022	3.6	1.4


*Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль*

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд туссан боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдаагүй 9 (Хавсралт 2) шилжих төсөлд, эрүүл мэндийн төвийн барилгын 5 төсөл, шүүх шинжилгээний лабораторийн 1 төсөл, гэр хорооллын шугам сүлжээний 1 төсөл, 1 ТЭЗҮ, багийн хөгжлийг дэмжих 1 төсөл байна. Эрүүл мэндийн 5 шилжих төслийн 3 нь Өвөрхангай аймагт, 2 төсөл нь Улаанбаатар, Баян-Өлгий аймагт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байжээ. Эдгээр төсөл 2018-2022 онд эхэлсэн байна.

2024 оны төсвийн төсөлд туссагүй боловч 2024 оны төсвийн тухай хуульд нэмж баталсан, их засварын 4 шилжих төсөл, тоног төхөөрөмжийн 1 шилжих төсөл байна. Эдгээр 4 шилжих төсөл нь Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар, Хэнтий аймгийн шугам сүлжээний засвар, Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт, Улсын төв II эмнэлгийн барилгын их засварын төсөл юм. Эдгээр 4 төслийн анхны төсөвт өртөг дунджаар 53 хувиар өсөж, 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан байна.

2024 оны төсвийн төсөлд тусгагдаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан 63 төслийн хамгийн урт хугацаанд хэрэгжиж буй төсөл нь 2011 онд эхэлсэн байна (Зураг 5). Энэ төсөл нь Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт баригдах газар хөдлөлийн сорилын лабораторийн барилга юм. Мөн 11 дэх жилдээ хэрэгжиж буй 2 төсөл байна. Эдгээр төсөл нь Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн шүүхийн нэгдсэн байр, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн дэд бүтцийн төсөл юм.

#### ЗУРАГ 5. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2024 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ШИЛЖИХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОО, ТӨСӨЛ ЭХЭЛСЭН ОН

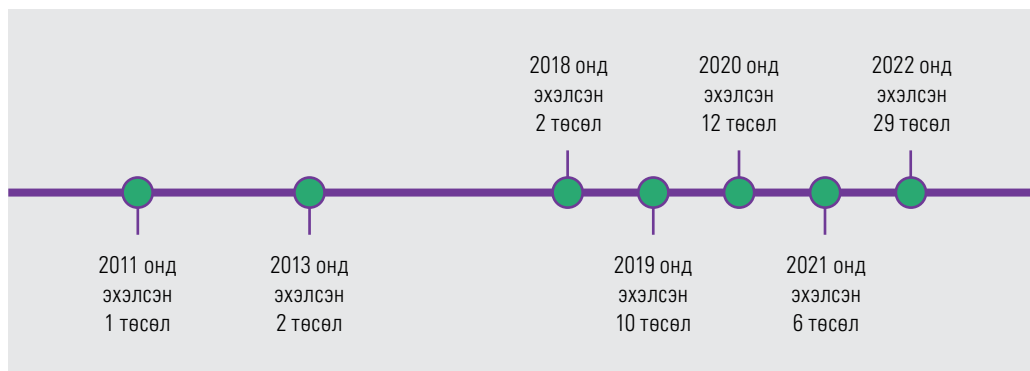

Эх сурвалж: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль

## ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд туссан болон 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн дүн шинжилгээнээс гарсан дүнг тоймлоход дараах байдалтай байна. Үүнд:

- 2024 оны төсвийн тухай хуульд тусгасан шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тоо, 2024 оны төсөвт өртгийн нийт дүн, 2024 онд олгох санхүүжилтийн дүн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөлд туссан дүн тус бүрээс өссөн. Хамгийн их өссөн эдийн засгийн ангилал нь барилга байгууламж байна.
- 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөлд туссан шилжих төсөл дээр УИХ-аас нийт 416.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 63 шилжих төслийг нэмж баталсан байна. Эдгээр шилжих төслийн эхний төсөл 2011 онд эхэлсэн байна. Ийнхүү өмнөх онуудад эхэлсэн 60 гаруй шилжих төслийг Засгийн газраас төсвийн төсөлд тусгаагүй орхигдуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 27.6 дахь заалт буюу төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө шилжих буюу он дамжин хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээг нэн тэргүүнд тусгах шаардлагыг хэрэгжүүлээгүйг харуулж байна. УИХ-аас нэмсэн шилжих төслүүдэд 2024 онд 39.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгохоор баталжээ.
- Хэрэгжилт нь удааширсан төслүүдийн төсөвт өртөг ихээхэн нэмэгдсэнээс гадна өөрчлөлтийн хувь хэмжээ ихээхэн ялгаатай байна.
- Хамгийн олон шилжих төслийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Аймгуудыг авч үзвэл, Төв аймагт хэрэгжүүлэх шилжих төсөл хамгийн их төсвийг, Хэнтий аймагт хэрэгжүүлэх шилжих төсөлд хамгийн их санхүүжилтийг 2024 онд төсөвлөсөн бол Ховд аймагт хамгийн олон шилжих төслийг 2024 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ.
- Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцын шилжих төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжид бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай харьцуулахад хамгийн олон төсөл, их төсөвт өртөг, санхүүжилтийг 2024 онд төлөвлөжээ.
- Дийлэнх төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд 2024 оны төсвийн төсөлд туссан шилжих төслүүдийн төсөвт өртгийн нийт дүн 2024 оны төсвийн тухай хуульд өссөн бөгөөд Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын шилжих төсөл хамгийн их өссөн байна.
- Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын төсөл нийт шилжих төсөлд өндөр хувь эзэлж байна.

## АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. 2024 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль
2. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төслийн баримт бичиг



# ХАВСРАЛТ 1. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСААГҮЙ БОЛОВЧ УИХ-ААС НЭМЖ БАТАЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 63 ШИЛЖИХ ТӨСӨЛ

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	ШЕЗ: Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр	УБ ХУД	2013	15.0	76.0	61.0	406%
2	БХБС: Гэр хорооллын цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	7.0	22.7	15.7	224%
3	СОЁЛЫН САЙД: Үндэсний номын сангийн барилга	УБ СБД	2012	12.0	25.7	13.7	114%
4	ЗТХС: Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл	Дархан-Уул Шарын гол сум	2019	41.6	52.4	10.8	26%
5	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	УБ СХД	2018	2.8	9.5	6.7	239%
6	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Баянхонгор Баянцагаан сум	2019	3.4	9.5	6.1	178%
7	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Хэнтий Өмнөдэлгэр сум	2020	4.0	9.4	5.4	134%
8	БХБС: Барилга байгууламжийн хийц бүтээцийн газар хөдлөл, сорил шинжилгээний төв лабораторийн барилга	УБ СХД	2011	2.8	8.2	5.3	190%

Хавсралт 1-ийн үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
9	МУСОНБТСҮХД: Усан бассейн спорт цогцолборын барилга	Баянхонгор Баянхонгор сум	2019	9.0	14.0	5.0	56%
10	БХБС: Сумын төвийн төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээний их засвар	Хэнтий Бор-Өндөр сум	2022	10.0	14.5	4.5	45%
11	БШУС: Спорт, урлагийн цогцолбор сургууль, 320 суудал	Хөвсгөл Мөрөн сум	2020	2.5	7.0	4.5	180%
12	ХНХС: Ахмадын сувиллын барилга	УБ НД	2022	2.6	6.8	4.2	161%
13	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ ЧД	2022	2.9	7.0	4.0	139%
14	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ ЧД	2022	2.9	6.7	3.9	135%
15	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ СХД	2020	3.5	7.0	3.5	99%
16	БХБС: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны шинэчлэл	УБ НД	2022	5.0	8.4	3.4	68%
17	БШУС: Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл	Дархан-Уул Дархан сум	2022	2.0	5.3	3.3	166%
18	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 200 суудал	Хөвсгөл Ренчинлхүмбэ сум	2020	1.4	4.6	3.2	229%
19	БШУС: Сургуулийн барилга, 250 суудал	Орхон Баян-Өндөр сум	2018	1.0	4.0	3.0	295%

Хавсралт 1-ийн үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
20	МУСЗГХЭГД: Хорооны барилга	УБ СХД	2022	2.0	4.8	2.8	138%
21	БШУС: Дотуур байрны барилга, 120 ор	Өмнөговь Даланзадгад сум	2022	2.3	4.6	2.3	100%
22	БШУС: Сургуулийн барилга, 960 суудал	УБ БЗД	2019	6.5	8.7	2.2	33%
23	ЗТХС: Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга	Баян-Өлгий Өлгий сум	2022	2.5	4.6	2.1	83%
24	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ БЗД	2022	3.6	5.3	1.7	47%
25	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 200 суудал	Дорнод Булган сум	2020	1.6	3.3	1.7	102%
26	БХБС: Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, инженерийн дэд бүтэц	УБ СХД	2013	5.0	6.5	1.5	29%
27	ЗТХС: Хануй голын төмөр бетон гүүр	Архангай Хайрхан сум	2021	3.5	4.9	1.4	41%
28	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 300 суудал	Баян-Өлгий Улаанхус сум	2019	1.1	2.5	1.4	124%
29	БШУС: Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор	УБ БЗД	2020	2.5	3.8	1.3	52%
30	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ ХУД	2022	4.6	5.8	1.3	28%
31	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	Баян-Өлгий Булган сум	2021	0.8	1.9	1.2	157%
32	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор	Завхан Яруу сум	2022	1.9	3.1	1.2	62%

Хавсралт 1-ийн үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
33	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга	Завхан Тосонцэнгэл сум	2020	1.5	2.7	1.2	79%
34	БШУС: Дотуур байрны барилга, 160 ор	Төв Зуунмод сум	2022	2.1	3.2	1.1	55%
35	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 240 суудал	Дундговь Цагаандэлгэр сум	2019	1.2	2.3	1.1	86%
36	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Төв Жаргалант сум	2021	0.6	1.6	1.0	174%
37	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан Цагаанхайрхан сум	2022	1.2	2.1	0.9	72%
38	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 200 суудал	Завхан Түдэвтэй сум	2019	1.2	2.1	0.9	73%
39	ХЗДХС: Цагдаагийн газрын барилга	Архангай Эрдэнэбулган сум	2022	5.4	6.2	0.8	16%
40	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай Хужирт сум	2021	1.0	1.7	0.7	71%
41	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Хэнтий Биндэр сум	2020	0.5	1.2	0.7	149%
42	БХБС: Үерийн далан	Өвөрхангай Хархорин сум	2022	2.0	2.6	0.6	30%
43	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга	Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ сум	2019	0.5	1.1	0.6	113%
44	ЭМС: Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/- Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг барилгын их засвар	УБ БЗД	2020	0.9	1.6	0.6	70%

Хавсралт 1-ийн үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
45	ЭМС: Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор	Баян-Өлгий Ногооннуур сум	2021	0.2	0.8	0.6	382%
46	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай Богд сум	2021	1.0	1.6	0.6	59%
47	БШУС: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор	Архангай Тариат сум	2019	0.5	1.1	0.6	124%
48	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан Отгон сум	2022	1.7	2.2	0.5	30%
49	МУСЗГХЭГД: Засаг даргын Тамгын газрын барилга	Өвөрхангай Тарагт сум	2019	1.0	1.5	0.5	48%
50	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	УБ БГД	2022	2.0	2.4	0.4	18%
51	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Увс Давст сум	2022	1.2	1.5	0.4	33%
52	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Завхан Цагаанчулуут сум	2020	1.1	1.4	0.3	25%
53	ХНХС: Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга	УБ БНД	2022	1.0	1.2	0.3	30%
54	БШУС: Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж	УБ ЧД	2022	1.0	1.3	0.3	29%
55	МУСЗГХЭГД: Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар	Архангай Ихтамир сум	2021	0.3	0.5	0.2	67%
56	БОАЖС: Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн барилга	Өвөрхангай Хужирт сум	2022	0.5	0.6	0.2	40%

Хавсралт 1-ийн үргэлжлэл

№	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч/Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
57	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай Хайрхандулаан сум	2022	0.3	0.5	0.2	82%
58	СОЁЛЫН САЙД: Өв соёл, хүндэтгэлийн өргөө	Ховд Үенч сум	2020	0.2	0.2	0.0	0%
59	БШУС: Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тоног төхөөрөмж	УБ БЗД	2022	2.2	2.2	0.0	0%
60	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2022	7.4	7.0	(0.5)	-6%
61	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Ховд Жаргалант сум	2022	2.2	2.1	(0.1)	-4%
62	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Ховд Мянгад сум	2022	2.0	1.8	(0.2)	-10%
63	МУСЗГХЭГД: Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж	Хөвсгөл	2022	3.6	1.4	(2.2)	-61%

## ХАВСРАЛТ 2. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУССАН БОЛОВЧ 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ТУСААГҮЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 9 ШИЛЖИХ ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эжэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсвийн төсөлд туссан төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг	2018	2.8	9.5	6.7	239%
2	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хужирт сум	2021	1.0	1.7	0.7	71%
3	Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор	Баян-Өлгий, Ногооннуур сум	2021	0.2	0.8	0.6	381%
4	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Богд сум	2021	1.0	1.6	0.6	59%
5	Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга	Баян-Өлгий, Өлгий сум	2022	2.1	2.5	0.4	19%
6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум	2022	0.3	0.5	0.2	82%
7	Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний 2 дугаар ээлжийн ажил	Хөвсгөл, Мөрөн сум	2022	7.0	7.0	0.0	0%
8	Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл	Орхон, Баян-Өндөр сум	2022	5.0	5.0	0.0	0%
9	Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр	Хөвсгөл, Ховд	2022	3.6	1.4	-2.2	-61%

## ХАВСРАЛТ 3. МОНГОЛ УЛСЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД БАТЛАГДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЛЖИХ ТӨСЛҮҮДИЙН АНХНЫ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ БА 2024 ОНЫ ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

А. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд: 2010-2015 онд эхэлсэн төслүүд

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	МУСОНБТСҮХД: Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал	УБ БЗД	2010	2.6	13.6	11.0	431%
2	МУСОНБТСҮХД: Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал	УБ НД	2010	1.9	15.0	13.1	697%
3	СОЁЛЫН САЙД: "Төв халх" дуулалт жүжгийн театр	Дундговь Сайнцагаан сум	2011	6.8	10.5	3.7	55%
4	СОЁЛЫН САЙД: Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал	Завхан Улиастай сум	2011	3.0	19.4	16.4	547%
5	МУСОНБТСҮХД: Спорт цогцолбор, 2200 суудал	Дархан-Уул Дархан сум	2011	11.0	36.4	25.3	229%
6	БШУС: Шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, спорт танхимын барилга	УБ БЗД	2012	4.0	5.3	1.3	32%
7	СОЁЛЫН САЙД: Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга	Архангай Эрдэнэбулган сум	2012	7.1	21.0	13.9	195%
8	БШУС: ХААИС-ийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр	Орхон Баян-Өндөр сум	2013	2.2	10.6	8.4	388%
9	БХБС: Сумын төвийн шинэчлэл	Хэнтий Биндэр сум	2014	5.0	5.4	0.4	9%
10	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Орхон Баян-Өндөр сум	2014	1.3	1.6	0.4	30%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
11	МУСОНБТСҮХД: Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал	УБ БГД	2014	6.4	10.0	3.7	57%
12	ХНХС: Усан спорт цогцолбор	УБ СХД	2014	5.0	17.2	12.2	245%
13	БХБС: Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ш800-ийн гол шугамыг Ш1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/	УБ СХД	2014	15.6	39.7	24.0	154%
14	БШУС: Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн барилга төслийн Монголын талын хөрөнгө	УБ БЗД	2015	12.9	23.0	10.1	78%

Б. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд: 2018-2019 онд эхэлсэн төслүүд

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	БШУС: Спорт заалны барилга	Орхон Баян-Өндөр сум	2018	0.8	0.8	-	0%
2	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сум	2018	2.2	2.2	-	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
3	БХБС: Нийслэл, аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт	Улсын хэмжээнд	2018	35.0	4.1	(30.9)	-88%
4	БХБС: Нийслэл, аймгийн төвүүдийн үерийн хамгаалалтын шинэчлэлт, зураг төсвийн хамт	Улсын хэмжээнд	2018	15.0	0.3	(14.7)	-98%
5	БШУС: Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор /66 дугаар цэцэрлэг/	УБ БГД	2018	2.5	2.1	(0.4)	-16%
6	ХХААХҮС: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга	Говьсүмбэр Сүмбэр сум	2018	2.2	2.4	0.2	9%
7	БХБС: Халуун ус, ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга	Дундговь Цагаандэлгэр сум	2018	0.3	0.4	0.2	65%
8	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Сэлэнгэ Орхонтуул сум	2018	0.9	1.2	0.3	37%
9	МУСОНБТСҮХД: Оюуны спортын ордны барилга	УБ ХУД	2018	4.0	4.3	0.3	7%
10	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор	УБ СБД	2018	2.1	2.6	0.5	25%
11	БШУС: Сургуулийн барилга, 920 суудал	УБ БЗД	2018	6.6	7.1	0.5	8%
12	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	УБ СХД	2018	4.4	5.1	0.7	15%
13	ЭМС: Сэргээн засах төвийн барилга, 36 ор	УБ ХУД	2018	4.0	4.9	0.9	23%
14	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Говь-Алтай Халиун сум	2018	0.9	2.0	1.1	122%
15	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Говь-Алтай Дэлгэр сум	2018	2.1	3.5	1.4	66%
16	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ ЧД	2018	2.0	3.6	1.6	82%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
17	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	УБ СХД	2018	5.6	7.1	1.6	28%
18	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал	УБ БГД	2018	3.8	5.8	1.9	50%
19	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	УБ СБД	2018	1.5	4.1	2.6	170%
20	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал	УБ ЧД	2018	4.0	6.8	2.8	70%
21	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Хөвсгөл Чандмань-Өндөр сум	2018	3.6	6.8	3.2	88%
22	БШУС Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал	УБ БГД	2018	3.3	7.9	4.6	142%
23	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	Сүхбаатар Баяндэлгэр сум	2019	2.1	2.1	-	0%
24	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл	Сэлэнгэ Мандал сум	2019	3.8	3.8	-	0%
25	МУСОНБТСҮХД Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга	Увс Улаангом сум	2019	4.1	4.1	-	0%
26	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Хөвсгөл Төмөрбулаг сум	2019	1.2	1.2	-	0%
27	БОАЖС: Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцын антены цамхгийн байр	УБ	2019	5.2	5.1	(0.2)	-3%
28	ХНХС: Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга	УБ СБД	2019	2.5	2.3	(0.2)	-10%
29	ЗТХС: Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл	Увс Улаангом сум	2019	2.0	1.9	(0.1)	-3%
30	ЗТХС: Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км	Сүхбаатар Баруун-Урт сум	2019	5.7	5.7	0.0	1%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
31	ЗТХС: Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км	Дорнод Хэрлэн сум	2019	10.9	10.9	0.0	0%
32	ЗТХС: Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км	Завхан Их-Уул сум	2019	2.0	2.0	0.0	1%
33	БШУС: Цэцэрлэгийн А байрны барилгыг буулгаж, шинээр барих	УБ ХУД	2019	2.4	2.4	0.0	0%
34	БШУС: Дотуур байрны барилга	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2019	1.6	1.6	0.0	0%
35	БШУС: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор	Говьсүмбэр Сүмбэр сум	2019	1.6	1.6	(0.0)	0%
36	ЗТХС: Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км	УБ СХД	2019	0.9	0.9	(0.0)	-3%
37	СОЁЛЫН САЙД: Солийн Данзаны нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн	Архангай Хотонт сум	2019	1.0	1.1	0.1	14%
38	ЗТХС: Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, зогсоол, 1 км	УБ ХУД	2019	1.5	1.6	0.1	5%
39	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	УБ БГД	2019	2.0	2.2	0.2	12%
40	БШУС: Бага сургуулийн барилга	Төв Бүрэн сум	2019	1.2	1.5	0.3	26%
41	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Дундговь Говь-Угтаал сум	2019	1.0	1.3	0.3	28%
42	МУСЗГХЭГД: Хорооны цогцолбор барилга	УБ СХД	2019	1.4	1.6	0.3	20%
43	ЗТХС: Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км	Дундговь Эрдэнэдалай сум	2019	1.8	2.1	0.3	14%
44	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 200 суудал	Завхан Нөмрөг сум	2019	1.2	1.6	0.4	31%
45	ЭМС: Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга	УБ БЗД	2019	1.6	2.0	0.4	23%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
46	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	УБ СБД	2019	3.7	4.1	0.4	9%
47	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ ЧД	2019	1.3	1.8	0.5	42%
48	БШУС: Дотуур байрны барилга, 150 ор	Дорнод Цагаан-Овоо сум	2019	1.5	2.0	0.5	31%
49	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Говь-Алтай Бигэр сум	2019	0.3	0.7	0.5	182%
50	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Говь-Алтай Алтай сум	2019	0.9	1.5	0.6	72%
51	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Говь-Алтай Дэлгэр сум	2019	0.9	1.5	0.6	69%
52	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Говь-Алтай Цээл сум	2019	0.9	1.5	0.6	67%
53	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Говь-Алтай Бугат сум	2019	0.3	1.0	0.7	281%
54	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Баянхонгор Баянхонгор сум	2019	5.2	6.0	0.8	16%
55	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ор	Баян-Өлгий Өлгий сум	2019	0.3	1.0	0.8	301%
56	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Говь-Алтай Цогт сум	2019	0.3	1.2	0.9	375%
57	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 240 суудал	Өвөрхангай Баянгол сум	2019	1.2	2.1	0.9	73%
58	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Хөвсгөл Цэцэрлэг сум	2019	3.5	4.6	1.1	31%
59	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Увс Наранбулаг сум	2019	3.9	5.1	1.2	31%
60	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Өмнөговь Цогт-Овоо сум	2019	3.5	4.7	1.2	33%
61	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Дорнод Хэрлэн сум	2019	4.0	5.4	1.4	36%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
62	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Дорнод Хэрлэн сум	2019	1.5	2.9	1.4	93%
63	БШУС: Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор	Говь-Алтай Төгрөг сум	2019	0.9	2.3	1.4	155%
64	ЭМС: Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор	Дундговь Сайнцагаан сум	2019	8.8	10.1	1.4	16%
65	БШУС: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор	УБ БЗД	2019	1.6	2.9	1.4	88%
66	СОЁЛЫН САЙД: Музейн барилга	Дорнод Хэрлэн сум	2019	3.0	4.5	1.5	49%
67	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 240 суудал	Хөвсгөл Арбулаг сум	2019	1.2	2.9	1.7	138%
68	БШУС: Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор	Говь-Алтай Жаргалан сум	2019	0.9	2.7	1.8	197%
69	БШУС: Бага сургуулийн барилга, 360 суудал	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2019	1.2	3.1	1.9	154%
70	ЗТХС: Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их Тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км	Архангай Батцэнгэл сум	2019	69.0	71.1	2.1	3%
71	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал	УБ ЧД	2019	2.5	4.9	2.4	97%
72	ЭМС: Ахмад настан, хүүхдийн эмнэлгийн барилга	УБ БЗД	2019	7.0	9.4	2.4	35%
73	БШУС: Сургуулийн барилга, 480 суудал	УБ СХД	2019	3.3	6.2	2.9	87%
74	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сум	2019	5.0	8.5	3.5	69%
75	БШУС: Сургуулийн барилга, 720 суудал	УБ СБД	2019	6.0	9.7	3.6	60%
76	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Архангай Цахир сум	2019	3.2	7.1	3.9	121%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
77	БШУС: Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2019	3.1	7.1	4.0	129%
78	ЗТХС: Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км	Төв Мөнгөнморьт сум	2019	48.0	52.1	4.1	9%
79	БХБС: Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем	УБ ХУД	2019	4.0	8.4	4.4	110%
80	ЭХС: Хөшөөтийн уурхайгаас Ховд аймгийн Үенч сум хүртэл 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Үенч дэд станцын өргөтгөл	Ховд Үенч сум	2019	21.2	26.6	5.4	26%
81	БШУС: Сургуулийн барилга, 640 суудал	Баян-Өлгий Өлгий сум	2019	5.0	10.6	5.6	112%
82	ЭМС: Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн өргөтгөлийн барилга	Баянхонгор Баянхонгор сум	2019	3.8	9.5	5.7	153%
83	ЭХС: Тайширын усан цахилгаан станцаас аймгийн төв рүү татах 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц	Говь-Алтай	2019	7.9	14.6	6.7	85%
84	БШУС: Сургуулийн барилга, 960 суудал	Хөвсгөл Тариалан сум	2019	4.0	11.2	7.2	180%
85	СОЁЛЫН САЙД: Аймгийн хөгжимт драмын "Ойрад" театрын барилга	Увс Улаангом сум	2019	6.8	15.4	8.6	126%
86	МУСОНБТСҮХД: Соёл, спорт цогцолборын барилга	Хөвсгөл Мөрөн сум	2019	2.0	10.9	8.9	445%
87	СОЁЛЫН САЙД: Дүүргийн соёлын ордны барилга	УБ СХД	2019	8.5	18.0	9.5	111%
88	ЭМС: Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор	Баян-Өлгий Өлгий сум	2019	8.8	28.7	19.9	227%
89	САНГИЙН САЙД: Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн хамт	Улсын хэмжээнд	2019	32.2	114.1	81.9	255%

В. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд: 2020 онд эхэлсэн төслүүд

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	БШУС: Дотуур байрны барилгын их засвар	Завхан Отгон сум	2020	0.4	0.4	-	0%
2	САНГИЙН САЙД: Татварын хэлтсийн барилга	УБ, Хөвсгөл, Увс, Баянхонгор	2020	15.9	15.4	(0.5)	-3%
3	ЗТХС: Хороолол доторх авто замын засвар	УБ БГД, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо	2020	4.7	4.4	(0.3)	-7%
4	БХБС: Орон сууцны гадна тохижилт	УБ СБД, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо	2020	2.0	1.9	(0.1)	-3%
5	ЗТХС: Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам	Ховд Жаргалант сум	2020	0.9	1.0	0.0	5%
6	БШУС: Бага сургуулийн барилгын өргөтгөлийн их засвар	Хөвсгөл Арбулаг сум	2020	0.2	0.2	(0.0)	-1%
7	БШУС: Шинээр баригдсан цэцэрлэг, соёлын төвийн дэд бүтэц, халаалтын зуух	Говь-Алтай Цээл сум	2020	0.2	0.2	(0.0)	-3%
8	БШУС: Бага сургууль, дотуур байрны барилгын өргөтгөлийн их засвар	Хөвсгөл Цэцэрлэг сум	2020	0.2	0.2	(0.0)	-7%
9	ЭМС: Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга	Ховд Алтай сум	2020	0.7	0.7	(0.0)	-5%
10	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл	Архангай Хашаат сум	2020	1.0	1.1	0.1	15%
11	ЗТХС: Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км	Хөвсгөл Тариалан сум	2020	10.3	10.4	0.1	1%
12	ЗТХС: Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км	УБ СХД	2020	1.5	1.6	0.1	7%
13	БХБС: Гэр хорооллын гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлэг, камержуулалт	УБ СХД	2020	1.0	1.1	0.1	9%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
14	ЗТХС: Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл	УБ ЧД	2020	2.0	2.1	0.1	5%
15	ХХААХҮС: Усан сан	Өвөрхангай Баянгол сум	2020	0.1	0.2	0.1	113%
16	БХБС: Ус зайлуулах суваг, шугам	УБ БГД	2020	0.4	0.4	0.1	23%
17	БШУС: Сургуулийн спорт заалны өргөтгөлийн барилга	УБ СХД	2020	1.1	1.1	0.1	5%
18	БШУС: Дотуур байрны барилга	Дорнод Хэрлэн сум	2020	1.8	2.0	0.2	12%
19	БХБС: Үерийн далан	Хэнтий Цэнхэрмандал сум	2020	0.6	0.8	0.2	31%
20	ЗТХС: Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км	УБ СХД	2020	1.8	2.0	0.2	10%
21	БХБС: Багийн явган хүний зам, тохижилт	Орхон Баян-Өндөр сум	2020	2.0	2.2	0.2	9%
22	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл	Архангай Өлзийт сум	2020	0.8	1.0	0.2	22%
23	БШУС: Дотуур байрны барилга, 100 ор	Дорнод Хөлөнбуйр сум	2020	1.6	1.9	0.3	21%
24	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, их засвар, 5 ор	Сэлэнгэ Жавхлант сум	2020	0.3	0.6	0.3	114%
25	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 250 суудал	Дундговь Дэлгэрцогт сум	2020	1.0	1.4	0.4	45%
26	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Баянхонгор Баян-Овоо сум	2020	1.6	2.0	0.4	28%
27	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Төв Эрдэнэсант сум	2020	0.7	1.1	0.4	47%
28	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын ордны гадна тохижилт	УБ СХД	2020	2.0	2.5	0.5	26%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
29	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	Баян-Өлгий Баяннуур сум	2020	0.4	0.9	0.5	133%
30	ЭМС: Эрүүл мэндийн төвийн барилга	Баянхонгор Хүрээмарал сум	2020	1.2	1.7	0.5	39%
31	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилгын үлдэгдэл	Говь-Алтай Тонхил сум	2020	0.2	0.7	0.5	231%
32	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	УБ ЧД	2020	2.2	2.8	0.6	28%
33	БШУС: Сургуулийн өргөтгөлийн барилга	УБ СХД	2020	2.0	2.6	0.6	31%
34	МУСЗГХЭГД: Багийн төвийн барилга	Ховд Буянт сум	2020	0.3	0.9	0.6	243%
35	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2020	1.0	1.6	0.6	60%
36	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл	УБ ХУД	2020	2.0	2.6	0.6	29%
37	МУСЗГХЭГД: Багийн төвийн цогцолборын барилга	Орхон Баян-Өндөр сум	2020	2.1	2.8	0.7	36%
38	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга	УБ СБД	2020	1.7	2.4	0.7	41%
39	БХБС: Ундны цэвэр усны шугам, 2.5 км	Хөвсгөл Цагаан-Уул сум	2020	1.0	1.7	0.7	69%
40	БШУС: Дотуур байрны барилга, 150 ор	Баянхонгор Богд сум	2020	2.1	2.8	0.7	33%
41	БШУС: Сургуулийн спорт заалны барилга	Хэнтий Хэрлэн сум	2020	1.0	1.7	0.7	68%
42	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Говьсүмбэр Шивээговь сум	2020	3.3	4.0	0.7	21%
43	МУСЗГХЭГД: Хорооны цогцолбор барилга	УБ БГД	2020	1.8	2.5	0.7	37%
44	МУСОНБТСҮХД: Спорт заалны барилга	Баянхонгор Шинэжинст сум	2020	0.6	1.2	0.7	119%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (Хувь)
45	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих	УБ БЗД	2020	3.8	4.6	0.8	21%
46	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	Баян-Өлгий Ногооннуур сум	2020	0.5	1.4	0.9	209%
47	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Завхан Баянхайрхан сум	2020	1.5	2.4	0.9	59%
48	МУСЗГХЭГД: Хорооны цогцолбор барилга	УБ БГД	2020	1.8	2.8	1.0	56%
49	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 240 суудал	Баянхонгор Өлзийт сум	2020	1.3	2.3	1.0	76%
50	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Хөвсгөл Улаан-Уул сум	2020	1.7	2.7	1.0	57%
51	СОЁЛЫН САЙД: Соёлын төвийн барилга, 300 суудал	Баян-Өлгий Толбо сум	2020	1.7	2.8	1.1	64%
52	БШУС: Сургуулийн барилга, 480 суудал	Дархан-Уул Дархан сум	2020	5.2	6.3	1.1	21%
53	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор	УБ ХУД	2020	2.8	3.9	1.1	38%
54	БШУС: Дотуур байрны барилга, 75 ор	Баянхонгор Баянбулаг сум	2020	1.0	2.2	1.2	122%
55	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР: Прокурорын газрын барилга	УБ БГД	2020	4.5	5.7	1.2	26%
56	БШУС: Сургуулийн барилга, 240 суудал	Завхан Эрдэнэхайрхан сум	2020	2.5	3.7	1.2	46%
57	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2020	1.5	2.9	1.4	90%
58	ХХААХҮС: Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц	Сүхбаатар	2020	1.4	2.9	1.5	111%
59	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	УБ СХД	2020	3.5	5.0	1.5	44%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
60	БШУС: Сургуулийн барилга, урлаг заал, 320 суудал	Хэнтий Батноров сум	2020	4.0	5.6	1.6	41%
61	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор	Баян-Өлгий Өлгий сум	2020	0.8	2.4	1.6	199%
62	БШУС: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	УБ ХУД	2020	1.5	3.1	1.6	102%
63	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ БЗД	2020	2.8	4.6	1.7	61%
64	БШУС: Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ НД	2020	3.3	5.0	1.7	52%
65	БШУС: Сургуулийн барилга, 250 суудал	Орхон Баян-Өндөр сум	2020	2.0	3.9	1.9	97%
66	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор	УБ ХУД	2020	3.0	5.0	2.0	67%
67	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ БЗД	2020	3.5	5.5	2.0	57%
68	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор	УБ БЗД	2020	3.5	5.5	2.0	56%
69	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2020	1.8	3.9	2.1	121%
70	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Баян-Өлгий Буянт сум	2020	3.0	5.2	2.2	74%
71	СОЁЛЫН САЙД: Соёл, спортын төвийн барилга, 250 суудал	Төв Баянжаргалан сум	2020	1.2	3.6	2.4	204%
72	СОЁЛЫН САЙД: Музейн барилга	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2020	5.0	7.5	2.5	51%
73	ХНХС: Ахмадын холбоо, сувиллын барилга	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2020	1.2	3.8	2.6	217%
74	БОАЖС: Эрдэнэзуу музейн “Аялал жуулчлалын гудамж” төсөл	Өвөрхангай Хархорин сум	2020	1.6	4.6	3.0	188%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
75	БШУС: Сургуулийн барилга, 160 суудал	Баянхонгор Заг сум	2020	1.5	4.5	3.0	193%
76	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2020	1.8	4.9	3.1	170%
77	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ СХД	2020	3.5	6.7	3.2	90%
78	БШУС: Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ БГД	2020	3.3	6.7	3.4	103%
79	БШУС: Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2020	1.8	5.8	4.0	220%
80	БШУС: Сургуулийн барилга, 320 суудал	Хэнтий Жаргалтхаан сум	2020	2.5	7.7	5.3	213%
81	ЗТХС: Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга	Хэнтий Дадал сум	2020	5.0	10.5	5.5	110%
82	БШУС: Сургуулийн барилгын өргөтгөл	УБ БЗД	2020	3.8	9.9	6.1	160%
83	СОЁЛЫН САЙД: Дуу бүжгийн "Боржигин" чуулгын барилга	Говьсүмбэр	2020	3.5	12.4	8.9	255%
84	БХБС: Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг	Баян-Өлгий Өлгий сум	2020	13.2	23.9	10.7	81%
85	ЭХС: Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл	Дорнод Хэрлэн сум	2020	52.0	69.7	17.7	34%
86	СОЁЛЫН САЙД: Байгалийн түүхийн музейн барилга	УБ Хан-Уул дүүрэг	2020	94.5	130.6	36.2	38%
87	БШУС: Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор	УБ	2020	94.0	154.5	60.5	64%

Г. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд: 2021 онд эхэлсэн төслүүд

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	ХХААХҮС Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл	Увс	2021	4.5	4.5	-	0%
2	БХБС Сумын төвийн тохижилт	Увс Улаангом сум	2021	7.8	1.0	(6.8)	-88%
3	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор	Увс Ховд сум	2021	1.0	1.0	0.0	5%
4	БШУС Боловсролын үнэлгээ, мэдээллийн нэгдсэн төвийн барилга	УБ	2021	15.0	15.0	(0.0)	0%
5	БХБС Олон улсын стандартад нийцсэн хүүхдийн тоглоомын талбай	УБ СБД, 18, 19, 20 дугаар хороо	2021	1.5	1.5	(0.0)	-1%
6	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	УБ БЗД, 12 дугаар хороо	2021	1.9	1.9	(0.0)	-1%
7	ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД Шилэн кабельд холбох, зураг төсөв боловсруулах	Баян-Өлгий Улаанхус сум	2021	0.6	0.6	(0.0)	-2%
8	ЗТХС Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг төсөв	УБ БГД	2021	0.2	0.1	(0.0)	-12%
9	МУСЗГХЭГД Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2021	7.0	7.0	(0.0)	0%
10	ЗТХС Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх	УБ ЧД	2021	3.0	3.0	(0.0)	-1%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
11	БХБС Эко жорлон төсөл	УБ ЧД	2021	1.0	1.1	0.1	12%
12	БШУС Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар	УБ БГД	2021	2.0	2.1	0.1	5%
13	БХБС Ухаалаг худаг бүхий нийтийн халуун усны барилга	Увс Зүүнхангай сум	2021	0.3	0.4	0.1	30%
14	СОЁЛЫН САЙД Соёлын төвийн барилга, 240 суудал	Булган Бугат сум	2021	1.6	1.6	0.1	3%
15	ХХААХҮС Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга	Сэлэнгэ Баянгол сум	2021	2.0	2.2	0.2	10%
16	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, урлаг заал	Өвөрхангай Хужирт сум	2021	0.3	0.4	0.2	77%
17	БХБС "Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр	Баянхонгор Эрдэнэцогт сум	2021	5.0	5.2	0.2	4%
18	БХБС "Жишиг гудамж" төсөл	УБ БЗД	2021	2.5	2.7	0.2	7%
19	ЗТХС Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам	Дорнод Хэрлэн сум	2021	2.0	2.2	0.2	8%
20	БХБС Нийтийн халуун усны барилга	Хөвсгөл Баянзүрх, Алаг-Эрдэнэ сум	2021	0.3	0.6	0.3	114%
21	СОЁЛЫН САЙД Соёлын төвийн барилга, 300 суудал	Сүхбаатар Баяндэлгэр сум	2021	2.0	2.3	0.3	15%
22	СОЁЛЫН САЙД Ахмадын урлаг, соёлын төвийн барилга	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	0.5	0.8	0.3	56%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
23	ХХААХҮС Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	1.0	1.3	0.3	27%
24	МУСОНБТСҮХД Спорт заалны барилга	Увс Малчин сум	2021	1.0	1.4	0.4	47%
25	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	0.4	0.8	0.4	105%
26	ЗТХС "Ентүм" зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, "Жинст" баг, "Хөгжил" хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2021	3.2	3.6	0.4	13%
27	ХХААХҮС Хүнс, ногооны агуулахын барилга, 500 тн	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	0.8	1.1	0.4	52%
28	ХХААХҮС Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, лабораторийн барилга	Баян-Өлгий Өлгий сум	2021	1.9	2.3	0.4	18%
29	БШУС Дотуур байрны барилга, 40 ор, гал тогооны хамт	Хэнтий Баянхутаг сум	2021	0.9	1.4	0.5	59%
30	ХЗДХС Цагдаагийн тасгийн байр	Өвөрхангай Богд сум	2021	0.3	0.9	0.6	208%
31	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Баян-Өлгий Өлгий сум	2021	1.5	2.1	0.6	40%
32	ХНХС Хүүхэд, залуучууд, ахмадын хөгжлийн барилга	УБ ХУД	2021	1.0	1.6	0.6	58%
33	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор	Булган Хутаг-Өндөр сум	2021	1.0	1.7	0.7	71%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
34	БШУС Сургуулийн номын сан, урлаг заалны өргөтгөл	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2021	1.2	1.9	0.7	57%
35	ЭМС Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2021	1.8	2.6	0.8	46%
36	БШУС Сум дундын сургуулиудын хүүхдийн зуслан	Булган Хишиг-Өндөр сум	2021	3.0	3.9	0.9	31%
37	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	Баян-Өлгий Өлгий сум	2021	1.5	2.4	0.9	61%
38	ЗТХС Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам	Төв Зуунмод сум	2021	8.2	9.1	0.9	11%
39	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Өвөрхангай Бат-Өлзий сум	2021	1.3	2.2	0.9	66%
40	МУСОНБТСҮХД Спорт заалны барилга, 300 суудал	Ховд Алтай сум	2021	1.3	2.3	1.0	80%
41	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Төв Лүн сум	2021	1.5	2.5	1.0	69%
42	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2021	1.3	2.3	1.0	78%
43	ХЗДХС Улсын хил хамгаалалтын зориулалтын инженерийн байгууламжийн шинэчлэлт	Улсын хэмжээнд	2021	17.3	18.3	1.0	6%
44	БШУС Цэцэрлэгийн барилга	Төв Угтаалцайдам сум	2021	1.3	2.3	1.0	77%
45	БШУС Сургуулийн спорт заалны барилга	Баян-Өлгий Баяннуур сум	2021	1.6	2.8	1.1	71%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
46	БШУС Сургуулийн спорт заалны барилга	УБ БЗД	2021	1.2	2.3	1.1	92%
47	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Архангай Төвшрүүлэх сум	2021	1.4	2.5	1.1	77%
48	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Архангай Цэнхэр сум	2021	1.5	2.6	1.1	71%
49	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Хөвсгөл Цэцэрлэг сум	2021	0.9	2.0	1.1	117%
50	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Говь-Алтай Цээл сум	2021	3.9	5.0	1.1	27%
51	ХНХС Спорт заал бүхий "Иргэдийн хөгжлийн төв"-ийн барилга	УБ ХУД	2021	2.2	3.4	1.2	55%
52	ХНХС Ахмадын төвийн барилга	Сэлэнгэ Мандал сум	2021	1.0	2.2	1.2	121%
53	ХНХС Залуучуудын хөгжлийн ордны барилга	Сэлэнгэ Сайхан сум	2021	1.1	2.4	1.3	115%
54	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор	УБ ЧД	2021	1.4	2.8	1.4	103%
55	БШУС Дотуур байрны барилга, 100 ор	Өвөрхангай Хархорин сум	2021	1.0	2.4	1.4	138%
56	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 120 ор	УБ ХУД	2021	1.5	3.0	1.5	101%
57	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 120 суудал	Өвөрхангай Уянга сум	2021	1.0	2.5	1.5	147%
58	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга	УБ НД	2021	3.3	4.9	1.6	48%
59	МУСОНБТСҮХД Спорт заалны барилга	Увс Хяргас сум	2021	1.0	2.5	1.6	167%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
60	ЭМС Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн барилга	УБ БЗД	2021	2.2	4.0	1.8	81%
61	МУСЗГХЭГД Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга	УБ ХУД	2021	18.8	20.7	1.9	10%
62	ХНХС Ахмадын сувиллын барилга	Булган Хишиг-Өндөр сум	2021	1.3	3.1	1.9	150%
63	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Сүхбаатар Дарганга сум	2021	1.6	3.6	2.0	128%
64	БШУС Дотуур байрны барилга, 200 ор	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	2.4	4.4	2.0	81%
65	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2021	1.8	3.9	2.1	120%
66	БХБС Сумын төвийн цэвэр усны шугам	Өвөрхангай Төгрөг сум	2021	0.5	2.7	2.2	498%
67	БШУС Дотуур байрны барилга, 100 ор	Хөвсгөл Бүрэнтогтох сум	2021	1.7	3.9	2.2	130%
68	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал	УБ БЗД	2021	3.8	6.0	2.2	57%
69	УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР Улсын ерөнхий прокурорын газрын харьяа байгууллагуудын конторын барилга	Улсын хэмжээнд	2021	7.9	10.3	2.3	29%
70	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл	УБ ХУД	2021	4.7	7.2	2.5	54%
71	БШУС Сургуулийн барилга, урлаг заал, 200 суудал	Хэнтий Мөрөн сум	2021	2.5	5.0	2.5	101%
72	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор	УБ ХУД	2021	1.3	3.7	2.5	195%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
73	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 280 ор	УБ БЗД	2021	2.5	5.2	2.7	107%
74	ХХААХҮС Бяслэгийн үйлдвэр	Хөвсгөл Жаргалант, Цагаан-Уул, Галт, Тосонцэнгэл, Ренчинлхүмбэ, Цагаан-Үүр, Рашаант, Их-Уул сум	2021	4.0	6.8	2.8	71%
75	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Говь-Алтай Тонхил сум	2021	2.8	5.6	2.8	100%
76	БШУС Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	УБ СХД	2021	4.0	6.9	2.9	74%
77	МУСОНБТСҮХД Спорт заалны барилга, 500 суудал	Говь-Алтай Цогт сум	2021	1.5	4.4	2.9	195%
78	БШУС Сургуулийн барилга, 440 суудал	Өвөрхангай Бат-Өлзий сум	2021	5.0	7.9	2.9	57%
79	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Архангай Батцэнгэл сум	2021	3.0	6.1	3.1	102%
80	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Төв Заамар сум	2021	2.9	6.2	3.3	116%
81	ХХААХҮС Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах	Баянхонгор	2021	12.0	15.3	3.3	27%
82	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	Хэнтий Бор-Өндөр сум	2021	2.2	5.6	3.4	154%
83	МУСОНБТСҮХД Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор	УБ СХД	2021	5.0	8.6	3.6	72%
84	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор	УБ ХУД	2021	2.5	6.1	3.6	142%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
85	ЭХС Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах	Ховд	2021	12.0	15.7	3.7	31%
86	ХНХС Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга	Баян-Өлгий Өлгий сум	2021	1.9	6.8	4.9	253%
87	БШУС Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал	Баян-Өлгий Өлгий сум	2021	8.8	13.8	5.0	57%
88	БХБС "Сумын төвийн шинэчлэл" хөтөлбөр	Баянхонгор Галуут сум	2021	5.0	10.0	5.0	99%
89	ХЗДХС Эрээнцавын шалган нэвтрүүлэх заставын өргөтгөл, хилийн отряд шинээр байгуулах	Дорнод Чулуунхороот сум	2021	6.0	11.8	5.8	97%
90	МУСОНБТСҮХД Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга	Дорнод Хэрлэн сум	2021	9.9	17.3	7.4	75%
91	СОЁЛЫН САЙД Монголын Үндэсний археологи, палеонтологи, угсаатны музей, лаборатори	Төв Зуунмод сум	2021	18.0	26.2	8.2	45%
92	СОЁЛЫН САЙД "Саран хөхөө" театрын барилга, 700 суудал	Дорноговь Сайншанд	2021	9.5	18.5	9.0	95%
93	БШУС Сургуулийн барилга, 960 суудал	Дундговь Сайнцагаан сум	2021	5.5	14.7	9.2	168%
94	БХБС Чингис хотын бохир усны төв коллекторын шугамын шинэчлэл, өргөх станц	Хэнтий Хэрлэн сум	2021	5.0	15.5	10.5	210%
95	СОЁЛЫН САЙД Музей, номын сангийн цогцолбор	Дархан-Уул Дархан сум	2021	5.0	15.6	10.6	212%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
96	БШУС Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал	УБ СХД	2021	7.3	21.4	14.1	193%
97	БХБС Инженерийн шугам сүлжээ бүхий гэр хорооллын төсөл	Хөвсгөл Мөрөн сум	2021	2.3	16.9	14.6	634%

Д. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүд: 2022-2023 онд эхэлсэн төслүүд

(тэрбум төгрөгөөр)

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
1	БХБС Сумын төвийн инженерийн шугам сүлжээний холболт, уурын зуухны барилга	Говь-Алтай Бигэр сум	2022	2.5	2.5	-	0%
2	БШУС Багшийн хөгжлийн төвийн барилга худалдан авах	Дархан-Уул Дархан сум	2022	1.8	1.8	-	0%
3	БХБС Хабитат, Мангирт чиглэлийн дулаан хангамжийн 2 дугаар контур	Дархан-Уул Дархан сум	2022	7.6	7.6	-	0%
4	СОЁЛЫН САЙД "Хүүхэд залуучуудын театр"-ын тоног төхөөрөмж	УБ СХД	2022	5.0	5.0	-	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
5	ЗТХС Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв	УБ БГД	2022	0.6	0.6	-	0%
6	БШУС Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан автобус	УБ ХУД	2022	5.4	5.4	-	0%
7	БШУС Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 300 ор	УБ БГД	2022	4.8	4.8	-	0%
8	СОЁЛЫН САЙД Чойжин ламын сүм музейн сэргээн засвар	УБ СБД	2022	1.7	1.7	-	0%
9	ЭХС "Ховд дулааны станц"-ын өргөтгөл	Ховд	2022	8.0	8.0	-	0%
10	ХЗДХС Хилийн анги шинээр байгуулах	Хөвсгөл Цагаан-Уул сум	2022	8.3	8.3	-	0%
11	СОЁЛЫН САЙД Үндэсний номын сангийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж	УБ СБД	2022	11.0	0.8	(10.2)	-93%
12	БХБС Соёл амралтын хүрээлэн	Сүхбаатар Баруун-Урт сум	2022	9.3	5.5	(3.8)	-41%
13	БХБС Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц	Архангай	2022	30.0	27.0	(3.0)	-10%
14	БШУС Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байрыг буулгаж барих ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	УБ СБД	2022	28.4	26.0	(2.4)	-8%
15	ЗТХС Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км	Ховд	2022	43.6	41.6	(2.0)	-4%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
16	БХБС Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ	Баянхонгор Баянхонгор сум	2022	27.0	25.3	(1.7)	-6%
17	БШУС Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж	УБ СБД	2022	2.0	0.6	(1.4)	-72%
18	БХБС "Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц" төсөл	Төв	2022	33.0	31.8	(1.2)	-4%
19	ХХААХҮС Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл	Баянхонгор	2022	2.5	1.4	(1.1)	-42%
20	ЭХС Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй, хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж	УБ	2022	29.9	28.9	(1.0)	-3%
21	ЭХС 110/35/6 кВ-ын Баянхонгор дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл	Баянхонгор	2022	14.0	13.3	(0.7)	-5%
22	ХХААХҮС Малчид болон орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төслийн тоног төхөөрөмж	Өмнөговь Баяндалай, Мандал-Овоо, Ханхонгор, Ханбогд, Номгон, Манлай, Баян-Овоо, Сэврэй, Ноён, Цогтцэций, Булган сум	2022	1.7	1.2	(0.5)	-29%
23	БХБС "Гандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил	УБ БГД	2022	24.0	23.5	(0.5)	-2%
24	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Ховд Булган сум	2022	4.2	3.8	(0.4)	-9%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
25	ЭХС "Чингис хаан" аялал, жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамж	Хэнтий Батноров, Баян-Адарга, Дадал сум	2022	20.0	19.6	(0.4)	-2%
26	БШУС Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 280 ор	Булган Булган сум	2022	4.9	4.7	(0.3)	-5%
27	СОЁЛЫН САЙД Олон угсаатны театрын барилга	Ховд Жаргалант сум	2022	16.0	15.8	(0.3)	-2%
28	ЭМС Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж	УБ СБД	2022	2.0	1.7	(0.3)	-15%
29	БХБС Цэвэр усны шугам сүлжээний шинэчлэл, 1.5 км	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	2.4	2.1	(0.3)	-13%
30	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД БӨГӨӨД ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн цахилгаан хангамжийн өргөтгөл	Сэлэнгэ Алтанбулаг сум	2022	15.6	15.3	(0.3)	-2%
31	СОЁЛЫН САЙД Төв Монголын байгаль, түүх, соёлын цогцолборын барилга	Архангай Эрдэнэбулган сум	2022	4.4	4.1	(0.3)	-8%
32	БШУС Дотуур байрны барилга, 150 ор	Ховд Манхан сум	2022	3.3	3.2	(0.2)	-5%
33	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга	Говь-Алтай Цогт сум	2022	2.5	2.3	(0.2)	-6%
34	БХБС Түүхий эдийн захын дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ	Булган Орхон сум	2022	2.2	2.0	(0.2)	-7%
35	МУСОНБТСҮХД Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга	Дундговь Сайнцагаан сум	2022	13.0	12.8	(0.2)	-1%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
36	СОЁЛЫН САЙД Улсын Драммын Эрдмийн Театрын барилгын их засвар	УБ СБД	2022	2.4	2.2	(0.2)	-7%
37	БШУС Багш хөгжлийн танхимын тоног төхөөрөмж, тохижилт	УБ ЧД	2022	2.5	2.3	(0.2)	-7%
38	БШУС Дотуур байрны барилга, 150 ор	Булган Дашинчилэн сум	2022	3.7	3.5	(0.2)	-5%
39	ЗТХС Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км	Хэнтий Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум	2022	53.9	53.7	(0.2)	0%
40	БХБС Төвийн болон гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ, тохижилт	Төв Сэргэлэн, Эрдэнэ, Баянчандмань, Борнуур сум	2022	16.0	15.8	(0.2)	-1%
41	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Увс Завхан сум	2022	7.5	7.3	(0.2)	-3%
42	БШУС Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт	УБ ЧД	2022	2.0	1.8	(0.2)	-11%
43	ЭХС Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж, шугам сүлжээ, дэд станц	Улсын хэмжээнд	2022	12.0	11.8	(0.2)	-2%
44	БХБС Эко жорлон	УБ ЧД	2022	2.0	1.8	(0.2)	-11%
45	БХБС Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж	Сэлэнгэ Сант сум	2022	3.2	2.9	(0.2)	-8%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
46	БХБС Аймгийн төвийн 1800 айлын орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамж, инженерийн шугам сүлжээ	Дорнод Хэрлэн сум	2022	9.8	9.7	(0.1)	-1%
47	МУСЗГХЭГД Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж	Улсын хэмжээнд	2022	0.5	0.4	(0.1)	-12%
48	БХБС Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг гудамж" тохижилтын төсөл	УБ ЧД	2022	3.0	2.9	(0.1)	-2%
49	БХБС Найрамдал төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлэг	УБ БГД, 1, 3, 4 дүгээр хороо	2022	0.3	0.2	(0.1)	-20%
50	ЭХС Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний холболт, шугам сүлжээний шинэчлэл	УБ СБД	2022	1.0	0.9	(0.1)	-6%
51	БШУС Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тоног төхөөрөмж	Завхан	2022	0.5	0.4	(0.1)	-13%
52	ХХААХҮС Хадлангийн талбайг сэргээх "Борбулан" төсөл	Булган Баяннуур сум	2022	3.0	2.9	(0.1)	-2%
53	ХХААХҮС Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн лабораторийн барилга	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2022	2.0	1.9	(0.1)	-3%
54	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Увс Хяргас сум	2022	7.4	7.3	(0.1)	-1%
55	ЭХС Өгийнуурын зүүн эргээс Өгий баг хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц	Архангай Өгийнуур сум	2022	0.5	0.4	(0.1)	-14%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
56	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Сэлэнгэ Цагааннуур сум	2022	4.2	4.1	(0.1)	-2%
57	ХХААХҮС Үр тариа хадгалах агуулах	Увс, Дорнод	2022	5.0	4.9	(0.1)	-1%
58	ЭХС Тэшиг сумын төвийн 35 кВ-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	Булган Тэшиг сум	2022	6.8	6.7	(0.1)	-1%
59	БХБС Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн инженерийн шугам сүлжээ	Баянхонгор Баянхонгор сум	2022	7.0	7.0	(0.1)	-1%
60	БШУС Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж	Дундговь	2022	0.7	0.6	(0.1)	-10%
61	БХБС Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн засвар шинэчлэлт, тохижилт	УБ СБД	2022	2.0	1.9	(0.1)	-4%
62	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	3.8	3.7	(0.1)	-2%
63	БХБС "Буянт Ухаа-2" хороолол орчмын ариутгах татуургын гол шугамын 2 дугаар ээлжийн ажил	УБ ХУД	2022	2.1	2.0	(0.1)	-4%
64	БШУС Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ ЧД	2022	6.2	6.1	(0.1)	-1%
65	БХБС Сумын ундны усан хангамжийн дэд бүтэц	Говь-Алтай Халиун сум	2022	2.6	2.5	(0.1)	-4%
66	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	Ховд Жаргалант сум	2022	5.2	5.0	(0.1)	-2%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
67	БШУС Цэцэрлэг, сургуулийн тоног төхөөрөмж	УБ БЗД, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26 дугаар хороо	2022	0.5	0.4	(0.1)	-22%
68	БХБС Гудамж, талбайн тохижилт, ногоон байгууламж	Дундговь	2022	1.0	0.9	(0.1)	-11%
69	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал	Өвөрхангай Хужирт сум	2022	7.4	7.3	(0.1)	-2%
70	БШУС Дотуур байрны барилга, 100 ор	Баян-Өлгий Алтанцөгц сум	2022	2.9	2.8	(0.1)	-4%
71	БХБС Үерийн хамгаалалтын байгууламж	Булган Хутаг-Өндөр сум	2022	4.4	4.3	(0.1)	-3%
72	БШУС Боловсролын байгууллагуудын тоног төхөөрөмж	Төв	2022	1.7	1.6	(0.1)	-7%
73	ЭХС Алтай сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	Говь-Алтай Алтай сум	2022	8.5	8.4	(0.1)	-2%
74	БХБС Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмж	УБ БЗД	2022	0.3	0.3	(0.0)	0%
75	БШУС Дотуур байрны барилга, 100 ор	Хөвсгөл Шинэ-Идэр сум	2022	2.9	2.9	(0.0)	0%
76	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор	УБ БЗД	2022	3.2	3.2	(0.0)	0%
77	БХБС Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Шинэ хороо" төсөл	УБ СХД	2022	1.0	1.0	(0.0)	0%
78	БХБС Чингүнжавын гудамжны тохижилт	УБ БГД	2022	0.9	0.9	(0.0)	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
79	БШУС Хөдөө, аж ахуйн их сургуулийн харьяа Агроэкологи, бизнесийн сургуулийн барилгын их засвар	Дархан-Уул Дархан сум	2022	2.9	2.9	(0.0)	0%
80	БХБС Халуун усны барилга	Булган Могод сум	2022	0.2	0.2	(0.0)	-1%
81	БХБС Ундны усны худаг	УБ БЗД	2022	0.1	0.1	(0.0)	-2%
82	БШУС Албан бус боловсролын төвийн барилга	Сэлэнгэ Баруунбүрэн сум	2022	0.3	0.2	(0.0)	-1%
83	БХБС Ногоон хороо	УБ ЧД	2022	4.5	4.5	(0.0)	0%
84	БХБС Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадын засвар	УБ СХД, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29 дүгээр хороо	2022	2.0	2.0	(0.0)	0%
85	ЗТХС Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км	Архангай Ихтамир, Чулуут сум	2022	39.5	39.5	(0.0)	0%
86	ЗТХС Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км	Баянхонгор Баянхонгор сум	2022	8.0	8.0	(0.0)	0%
87	БХБС Сумын төвийн шинэчлэл	Баянхонгор Баацагаан сум	2022	5.0	5.0	(0.0)	0%
88	БХБС Орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ	Төв Зуунмод сум	2022	6.0	6.0	(0.0)	0%
89	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Орхон Баян-Өндөр сум	2022	7.4	7.4	(0.0)	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
90	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал	УБ НД, 5 дугаар хороо	2022	9.7	9.7	(0.0)	0%
91	БШУС Бага сургуулийн барилга, 160 суудал	Архангай Эрдэнэбулган сум	2022	4.1	4.1	(0.0)	0%
92	ЭХС Багийн төвийн сэргээгдэх эрчим хүчний холболт	Хөвсгөл Ренчинлхүмбэ сум	2022	0.6	0.6	(0.0)	-1%
93	БХБС Иргэдэд зориулсан ногоон орчин, тохижилт	УБ БГД	2022	1.0	1.0	(0.0)	-1%
94	ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙД Үүрэн холбооны сүлжээ	Баянхонгор	2022	1.5	1.5	(0.0)	-1%
95	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал	Дархан-Уул Дархан сум	2022	7.4	7.4	(0.0)	0%
96	ХХААХҮС Бизнес инкубатор төвийн барилга	Увс Улаангом сум	2022	2.3	2.3	(0.0)	0%
97	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	УБ БЗД, 24 дүгээр хороо	2022	4.2	4.1	(0.0)	0%
98	БХБС Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар	УБ СБД	2022	2.0	2.0	(0.0)	-1%
99	БШУС Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал	Завхан Баянтэс сум	2022	6.2	6.2	(0.0)	0%
100	ЭХС Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбох 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц	Төв Зуунмод сум	2022	18.6	18.6	(0.0)	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
101	ЗТХС Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км	Говьсүмбэр Шивээговь сум	2022	5.4	5.3	(0.0)	0%
102	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	УБ ХУД, 18 дугаар хороо	2022	4.2	4.1	(0.0)	0%
103	БХБС Жишиг сум	Сэлэнгэ Алтанбулаг сум	2022	4.0	4.0	(0.0)	-1%
104	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Дундговь Дэлгэрцогт сум	2022	2.9	2.9	(0.0)	-1%
105	ХХААХҮС Загвар хоршоод, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих барилга	Увс	2022	3.0	3.0	(0.0)	-1%
106	БШУС Шинээр баригдаж байгаа сургуулийн дотуур байрны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ	Говь-Алтай Төгрөг сум	2022	0.4	0.4	(0.0)	-5%
107	БШУС Дотуур байрны барилга, 150 ор	Хөвсгөл Цагаан-Уул сум	2022	2.9	2.9	(0.0)	-1%
108	БШУС Шинээр баригдаж байгаа сургуулийн дотуур байрны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ	Говь-Алтай Жаргалан сум	2022	0.4	0.3	(0.0)	-7%
109	БХБС Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт	УБ СБД	2022	1.0	1.0	(0.0)	-3%
110	БХБС Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар	УБ СБД, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо	2022	1.5	1.5	(0.0)	-2%
111	ЗТХС Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	10.0	10.0	(0.0)	0%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
112	СОЁЛЫН САЙД Аймгийн номын сангийн барилга	Өмнөговь Даланзадгад сум	2022	4.2	4.2	(0.0)	-1%
113	ЭХС Дулааны станцын халаалтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар хэсгийн 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл	Төв Зуунмод сум	2022	11.6	11.6	(0.0)	0%
114	БХБС Цэвэр усны шугамын шинэчлэл	Дархан-Уул Дархан сум	2022	5.6	5.6	(0.0)	-1%
115	БХБС Сум, багийн орчныг тохижуулах "Шинэ гудамж" төсөл	Увс Улаангом сум	2022	1.0	1.0	(0.0)	-5%
116	ХХААХҮС Түүхий эдийн төвийн барилга	Ховд Мөст сум	2022	0.4	0.5	0.1	36%
117	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД Зэвсэгт хүчний 338 дугаар ангийн цэргийн байрны барилга	Сүхбаатар Баруун-Урт сум	2022	1.9	2.1	0.1	7%
118	БШУС Сургуулийн барилгын урлаг заал, номын сан бүхий өргөтгөлийн барилга	Өвөрхангай Уянга сум	2022	2.0	2.1	0.1	6%
119	МУСЗГХЭГД Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга	Ховд Манхан сум	2022	2.0	2.1	0.1	6%
120	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор	Өвөрхангай Хайрхандулаан сум	2022	0.4	0.5	0.1	27%
121	БШУС Бага сургуулийн барилга, 160 суудал	Баян-Өлгий Ногооннуур сум	2022	2.3	2.4	0.1	4%
122	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор	Өвөрхангай Хархорин сум	2022	0.4	0.5	0.1	25%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
123	ЭМС Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга	УБ ХУД	2022	1.6	1.7	0.1	6%
124	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга	УБ БЗД	2022	2.8	3.1	0.2	8%
125	ХЗДХС Цагдаагийн тасгийн байр	Баянхонгор Богд сум	2022	0.6	0.8	0.2	37%
126	ХХААХҮС Ноос хяргах байгууламж, тоног төхөөрөмж	Дундговь Хулд сум	2022	0.3	0.5	0.2	88%
127	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Дорнод Хэрлэн сум	2022	3.0	3.2	0.2	7%
128	ХХААХҮС Хүнсний ногооны зоорь, 500 тонн	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	1.0	1.2	0.2	18%
129	БШУС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор	Өвөрхангай Баянгол сум	2022	0.4	0.6	0.2	41%
130	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор	Өвөрхангай Сант сум	2022	1.5	1.8	0.3	22%
131	ЭМС Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	0.5	0.8	0.3	66%
132	ЭМС Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга	УБ ХУД	2022	1.6	1.9	0.3	20%
133	ХХААХҮС Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл	Сэлэнгэ Баруунбүрэн сум	2022	0.5	0.8	0.3	61%
134	ХЗДХС Цагдаагийн тасгийн байр	Баянхонгор Жаргалант сум	2022	0.6	0.9	0.3	49%
135	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2022	2.9	3.2	0.3	10%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
136	ЗТХС Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м	Увс Цагаанхайрхан сум	2022	0.3	0.6	0.3	92%
137	БШУС Сургуулийн хичээлийн байрны барилга, 160 суудал	Говь-Алтай Гуулин тосгон	2022	2.9	3.1	0.3	9%
138	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, 15 ор	Өвөрхангай Бат-Өлзий сум	2022	1.5	1.9	0.4	27%
139	БХБС Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт	УБ СБД	2022	1.6	2.0	0.4	25%
140	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн цэргийн гал тогооны барилга	Баянхонгор Баянхонгор сум	2022	1.6	2.0	0.4	26%
141	БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн цэргийн гал тогооны барилга	Дорнод Чойбалсан сум	2022	1.6	1.9	0.4	26%
142	БХБС Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар	УБ ЧД	2022	3.0	3.4	0.4	13%
143	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор	УБ СБД	2022	1.5	1.9	0.4	24%
144	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	Хэнтий Биндэр сум	2022	4.2	4.7	0.5	13%
145	БШУС Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор	УБ БГД	2022	4.5	5.0	0.5	12%
146	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор	Өвөрхангай Төгрөг сум	2022	1.5	2.0	0.5	35%
147	БШУС Спорт заалны барилга, 250 суудал	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2022	1.2	1.7	0.5	44%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
148	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл	Хөвсгөл Арбулаг сум	2022	1.4	1.9	0.5	37%
149	ХЗДХС Цагдаагийн тасгийн байр	Хэнтий Баян-Овоо сум	2022	0.4	0.9	0.5	134%
150	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ НД	2022	4.6	5.0	0.5	11%
151	БШУС Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор	Баян-Өлгий Ногооннуур сум	2022	0.9	1.3	0.5	55%
152	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор	Өвөрхангай Гучин-Ус сум	2022	1.5	2.0	0.5	31%
153	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор	Говь-Алтай Чандмань сум	2022	1.6	2.2	0.6	41%
154	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Баян-Өлгий Улаанхус сум	2022	2.9	3.5	0.6	22%
155	БШУС Шинээр баригдаж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ	Говь-Алтай Дэлгэр сум	2022	1.0	1.6	0.6	65%
156	БШУС Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 320 ор	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	4.3	4.9	0.6	15%
157	БШУС Спорт заалны барилга, 250 суудал	Өвөрхангай Хархорин сум	2022	1.2	1.8	0.6	50%
158	ЭМС Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 50 ор	Төв Зуунмод сум	2022	5.5	6.1	0.6	11%
159	БХБС Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадын засвар	УБ БЗД	2022	2.1	2.7	0.6	28%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
160	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Говьсүмбэр Шивээговь сум	2022	2.2	2.8	0.6	26%
161	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ СХД	2022	4.6	5.1	0.6	12%
162	ХХААХҮС Арсайн газар тариалангийн услалтын систем	Увс Улаангом сум	2022	2.9	3.6	0.7	25%
163	ХНХС Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн барилга	УБ ЧД	2022	13.4	14.1	0.7	5%
164	ХХААХҮС Цөцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний ферм	Булган Тэшиг сум	2022	3.0	3.7	0.7	23%
165	БШУС Дотуур байрны барилга, 150 ор	Булган Хутаг-Өндөр сум	2022	3.2	3.9	0.7	22%
166	БШУС Насан туршийн боловсролын төвийн барилга	УБ БЗД	2022	2.5	3.2	0.7	27%
167	ХЗДХС Цагдаагийн тасгийн байр	Хэнтий Батноров сум	2022	0.4	1.0	0.7	174%
168	БШУС Сургуулийн спорт заалны барилга	Баян-Өлгий Булган сум	2022	1.6	2.3	0.7	41%
169	ЭМС Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, дотор сантехникийн засвар	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2022	2.7	3.6	0.8	30%
170	БШУС Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор	Дундговь Говь-Угтаал сум	2022	1.6	2.4	0.8	51%
171	БШУС Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 150 ор	Баянхонгор Баянхонгор сум	2022	1.8	2.6	0.8	45%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
172	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ БГД	2022	4.6	5.4	0.8	18%
173	САНГИЙН САЙД Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн барилга	Увс Улаангом сум	2022	1.9	2.7	0.8	40%
174	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	УБ СХД	2022	2.9	3.8	0.9	32%
175	СОЁЛЫН САЙД Соёлын төвийн барилга, 250 суудал	Говь-Алтай Халиун сум	2022	2.3	3.2	0.9	39%
176	ЭХС Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2022	4.5	5.5	1.0	23%
177	БХБС Ногоон байгууламж, тоглоомын талбай	УБ ЧД	2022	4.0	5.0	1.0	26%
178	ХХААХҮС Хөдөө аж ахуйн Кластер төслийн газар тариалан, малын тэжээлийн дэд төсөл	Баянхонгор	2022	10.0	11.0	1.0	10%
179	БХБС Ард Аюушийн өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг	УБ БГД	2022	0.5	1.5	1.0	190%
180	БШУС Спорт заалны барилга, 250 суудал	Өвөрхангай Хархорин сум	2022	1.2	2.2	1.0	81%
181	МУСОНБТСҮХД Спорт цогцолборын барилга, 150 суудал	УБ БХД	2022	1.3	2.4	1.1	81%
182	БШУС Сургуулийн барилга, 160 суудал	Ховд Мөнххайрхан сум	2022	4.9	6.0	1.1	22%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
183	ХНХС Нөхөн сэргээх, хүүхэд хөгжил, сургалтын төвийн барилга	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2022	3.5	4.6	1.1	31%
184	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Төв Жаргалант сум	2022	1.5	2.6	1.1	71%
185	МУСОНБТСҮХД Усан спорт сургалтын төвийн барилга	УБ СХД	2022	10.0	11.2	1.2	12%
186	БШУС Сургуулийн спорт заалны барилга	Говь-Алтай Дарви сум	2022	0.5	1.7	1.2	242%
187	СОЁЛЫН САЙД Соёлын төвийн барилга	Өвөрхангай Баруунбаян- Улаан сум	2022	0.5	1.7	1.2	242%
188	БШУС Сургуулийн барилга, урлаг заал	Дорнод Баяндун сум	2022	3.4	4.6	1.2	36%
189	БХБС Биеийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай	УБ СХД	2022	1.3	2.5	1.2	96%
190	ЭХС Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2022	2.4	3.6	1.2	48%
191	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Дундговь Эрдэнэдалай сум	2022	2.1	3.3	1.3	60%
192	ХЗДХС Нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий төв, цагдан хорих байр	Төв Зуунмод сум	2022	2.1	3.6	1.4	67%
193	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал	УБ ХУД	2022	9.7	11.1	1.4	14%
194	СОЁЛЫН САЙД Соёлын төвийн барилга, 400 суудал	Өвөрхангай Хужирт сум	2022	2.5	4.0	1.5	58%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
195	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ СХД	2022	4.6	6.1	1.6	34%
196	БШУС Дотуур байрны барилга, 100 ор	Увс Наранбулаг сум	2022	2.9	4.6	1.7	60%
197	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал	Дундговь Сайнцагаан сум	2022	9.5	11.2	1.7	18%
198	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал, спорт заал	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	7.5	9.3	1.8	24%
199	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2022	2.0	3.8	1.8	88%
200	БШУС Дотуур байрны барилга, 160 ор	Хөвсгөл Төмөрбулаг сум	2022	3.2	5.2	1.9	60%
201	БШУС Чулуунхороот сумДотуур байрны барилга, 160 ор	Дорнод Баян-Уул сум	2022	2.9	4.8	1.9	64%
202	БХБС Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	0.9	3.0	2.1	220%
203	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор	Баян-Өлгий Сагсай сум	2022	2.9	4.9	2.1	72%
204	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор	Сэлэнгэ Сүхбаатар сум	2022	4.2	6.4	2.2	54%
205	ЭМС Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 100 ор	Өвөрхангай Хархорин сум	2022	11.5	13.7	2.2	19%
206	ЗТХС Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км	Булган Хишиг-Өндөр сум	2022	29.9	32.1	2.2	7%



Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
207	БШУС Дотуур байрны барилга буулгаж, шинээр барих, 160 ор	Говь-Алтай Баян-Уул сум	2022	3.5	5.7	2.2	62%
208	ЭМС Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	2.1	4.4	2.3	108%
209	БШУС Сургуулийн барилгын өргөтгөл	УБ СБД	2022	2.6	5.2	2.6	102%
210	ЭМС Эрт илрүүлэг, оношилгооны төвийн барилга	УБ ЧД	2022	2.8	5.5	2.7	97%
211	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор	УБ СХД	2022	3.0	5.7	2.7	90%
212	БШУС Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор	УБ СХД	2022	3.0	5.7	2.7	88%
213	ЗТХС Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км	Төв Борнуур сум	2022	8.5	11.4	2.9	34%
214	БШУС Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор	УБ ХУД	2022	2.8	5.7	2.9	103%
215	ЭМС Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	4.9	7.9	3.0	62%
216	СОЁЛЫН САЙД Кино театрын барилга	Ховд Жаргалант сум	2022	2.5	5.4	3.0	121%
217	БХБС Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт	Говь-Алтай Есөнбулаг сум	2022	1.2	4.3	3.1	265%
218	БШУС Сургуулийн барилга, 960 суудал, спорт заал	Хөвсгөл Мөрөн сум	2022	9.9	13.1	3.2	32%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
219	ЭМС Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл	УБ ЧД	2022	16.0	19.3	3.3	21%
220	БШУС Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга	УБ БНД	2022	3.5	6.8	3.3	95%
221	БШУС Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих 640 суудал	УБ БГД	2022	9.0	12.4	3.4	38%
222	ЭМС Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн "Хүүхдийн зөвлөх поликлиник"-ийн барилгын өргөтгөл	УБ БГД	2022	17.3	20.7	3.4	20%
223	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал	Завхан Улиастай сум	2022	8.2	11.5	3.4	41%
224	ХХААХҮС Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих "Бяслаг" төсөл	Хөвсгөл Цэцэрлэг, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох, Түнэл, Эрдэнэбулган, Тариалан, Арбулаг, Шинэ-Идэр, Төмөрбулаг, Улаан-Уул сум	2022	5.0	8.7	3.7	75%
225	БХБС "Залуус-1" орон сууцны хорооллын төслийн гадна инженерийн 1 дүгээр хэлхээний шугам сүлжээ, барилга байгууламж, авто зам	УБ ХУД	2022	29.9	33.7	3.8	13%
226	БШУС Багшийн хөгжлийн төвийн барилга	Ховд Жаргалант сум	2022	3.0	7.2	4.2	141%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
227	БХБС Хуучин орон сууцны дахин төлөвлөлт, дэд бүтэц, хотын инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэчлэл	Өвөрхангай Арвайхээр сум	2022	1.0	5.2	4.2	420%
228	БШУС\ Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал	Хөвсгөл Галт сум	2022	10.1	14.4	4.3	43%
229	БШУС Сургуулийн барилга, 960 суудал	Увс Улаангом сум	2022	11.0	15.5	4.5	41%
230	БШУС Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 960 суудал	УБ БГД	2022	11.0	15.7	4.7	43%
231	ЭМС Сэргээн засах эмнэлгийн барилга, 40 ор	Өмнөговь Даланзадгад сум	2022	4.7	9.4	4.7	99%
232	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал	Хөвсгөл Жаргалант сум	2022	10.1	15.1	5.0	49%
233	БШУС Сургуулийн барилга, 320 суудал	Баян-Өлгий Цэнгэл сум	2022	7.4	12.4	5.0	67%
234	ЭМС Вакцины хяналтын лабораторийн барилга	УБ БЗД	2022	3.5	9.4	5.9	168%
235	МУСЗГХЭГД Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар	Улсын хэмжээнд	2022	0.5	6.5	6.0	1203%
236	БХБС Орон сууцжуулах төслийн дэд бүтэц	Баянхонгор Баацагаан сум	2022	2.3	9.7	7.4	320%
237	БШУС Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал	УБ БЗД	2022	10.2	17.9	7.7	76%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
238	МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжлийн сургалтын төвийн барилга	УБ	2022	4.4	12.5	8.1	183%
239	БШУС Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, спорт заал, 960 суудал	Орхон Баян-Өндөр сум	2022	8.2	16.5	8.3	100%
240	ЗТХС Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км	Хэнтий, Дорнод Норовлин сум, Баян-уул сум	2022	66.7	75.4	8.6	13%
241	БХБС Аймгуудын шинэ суурьшлын бүсэд баригдах орон сууцны хорооллын шугам сүлжээ, дэд бүтэц	Улсын хэмжээнд	2022	100.0	109.9	9.9	10%
242	САНГИЙН САЙД Төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл хангах	Улсын хэмжээнд	2022	8.0	18.0	10.0	125%
243	ЭМС Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгын их засвар	УБ БГД	2022	12.1	23.1	11.0	91%
244	БХБС Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж төсөл	Улсын хэмжээнд	2022	45.9	61.8	15.9	35%
245	ЗТХС Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км	Өвөрхангай Бат-Өлзий сум	2022	51.6	67.9	16.3	32%
246	ХХААХҮС "Шинэ Ховд" үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт	Ховд Жаргалант сум	2022	19.3	35.9	16.7	87%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
247	ЭХС Хөшөөтийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	Ховд Дарви сум	2022	5.5	25.7	20.2	365%
248	БХБС Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ	Хэнтий Хэрлэн сум	2022	30.0	51.0	21.0	70%
249	ЭМС Нийслэлийн 2 дугаар төрөх "Хүрээ амаржих" газрын барилга	УБ СБД	2022	18.0	45.5	27.4	152%
250	ЗТХС Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км	Дорнод Баян-Уул сум	2022	49.8	84.9	35.1	70%
251	ЗТХС Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км	Хэнтий Батноров, Норовлин сум	2022	109.1	151.9	42.7	39%
252	ЗТХС Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км	Төв Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум	2022	115.9	185.4	69.5	60%
253	ЗТХС Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км	Дорнод	2022	114.0	187.0	73.0	64%
254	ЭХС "Хөшигийн хөндийн шинэ хотын инженерийн дэд бүтэц" төсөл	Төв	2023	138.4	138.4	-	0%

Хавсралт 3-ын үргэлжлэл

№	Төслийн нэр	Байршил	Эхэлсэн он	Анхны төсөвт өртөг	2024 оны төсөвт өртөг	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт	Төсөвт өртгийн өөрчлөлт (хувь)
255	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТОЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА Түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах асуудлын хүрээнд захиргааны зарим байгууллагын нэгдсэн цогцолбор барилгын дуусгал	УБ ХУД	2023	45.0	45.0	-	0%
256	МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТОЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА Нийтийн тээврийн автобус	УБ	2023	318.0	317.9	(0.1)	0%



